

Manual de Normas y Procedimientos

Gestión de Cambios

Agosto 2022

PRESENTACIÓN

El Manual de Normas y Procedimientos de Control de Gestión Cambios, es de uso exclusivo de la Vicepresidencia de Tecnología de la Información de Seguros Constitución C.A.

Su contenido es de uso confidencial.

Está prohibida su reproducción total o parcial.

TABLA DE CONTENIDO

Certificación y Aprobación 4
Hoja de Control de Cambios y Actualizaciones 4
Objetivo 6
Alcance 6
Normas Generales de Uso del Manual 7
Políticas 8
Normas Generales para la Gestión de Cambios 30
I. Conceptualización y Bases Teóricas 34
1. Gestión de Cambios 34
2. Comité de Cambios (CC) 39
3. Comité Ejecutivo de Cambios (CEC) 41
4. Comité de Cambios de Emergencia de Alto Impacto (CCE) 43
5. Indicadores y Métricas 45
6. Roles y Responsabilidades 47
II. Desarrollo de Procesos 49
1. Macro Proceso para Gestionar Control de Cambio 49
2. Proceso para Registrar Solicitudes de Control de Cambio 50
3. Proceso para Revisar Solicitudes de Control de Cambio 53
4. Proceso para Evaluar y Planificar Control de Cambio 56
5. Proceso para Implantar Control de Cambio 59
6. Proceso para Realizar Cambios de Tipo Estándar 63
7. Proceso para Realizar Cambios de Tipo Emergencia 66
8. Proceso para Realizar Cambios de Tipo Planificado 71
9. Proceso para Evaluar y Cerrar Control de Cambio 74
Anexos 77

CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN

El Manual de Normas y Procedimientos de Control de Gestión de Cambios, ha sido elaborado por la Gerencia de Proyectos y Procesos y revisado por la Gerencia de Gestión de la Demanda, Gerencia de Seguridad de la Información, Gerencia de Tecnología y Gerencia de Sistemas de Seguros Constitución C.A.

Las áreas usuarias responsables en el cumplimiento en lo establecido en este documento serán:

Nombre y Apellido	Cargo	Firma	Fecha
Ricardo Manzano	Vp. Tecnología de la información		04/08/2022
Nelson Agudelo	Gerente de Tecnología		04/08/2022
Jesús López	Jefe de Seguridad de la Información		04/08/2022
Carlos Chávez	Jefe de Gestión de Cambios y Certificaciones		04/08/2022
Daiyolan Angulo	Gerente de Organización y Procesos		04/08/2022
Jenileth Albornoz	Consultor de Organización y Procesos		04/08/2022

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES

Fecha de emisión	Versión N°	Responsable	Observaciones
20/02/2014	1.0	Gerencia de Organización y Procesos	Emisión del Manual
04/08/2022	1.1	Gerencia de Organización y Procesos	Actualización de Fechas y nombres de los VP, Gerentes y Jefes de Áreas involucrados

OBJETIVO

Establecer las normas y procedimientos que deben seguirse en la ejecución de los Procesos de Control de Gestión de Cambio, precisando las actividades y sus responsables para controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar alteraciones arbitrarias, fortaleciendo las labores de auditoría y control interno

ALCANCE

El alcance de este documento se circunscribe al proceso de Control de Gestión de Cambios, el cual forma parte integral de los procesos ejecutados por el Asesor de Gestión de Cambios en la Gerencia de Gestión de la Demanda, adscrita a la Vicepresidencia de Tecnología de la Información de Seguros Constitución C.A, los procedimientos descritos en este documento son:

- Macro Proceso para Gestionar Control de Cambio.
- Proceso para Registrar Solicitudes de Control de Cambio.
- Proceso para Revisar Solicitudes de Control de Cambio.
- Proceso para Evaluar y Planificar Control de Cambio.
- Proceso para Implantar Control de Cambio.
- Proceso para Realizar Cambios de Tipo Estándar.
- Proceso para Realizar Cambios de Tipo Emergencia.
- Proceso para Realizar Cambios de Tipo Planificado.
- Proceso para Evaluar y Cerrar Control de Cambio

NORMAS GENERALES DEL USO DEL MANUAL

1. Los Manuales de Normas y Procedimientos son documentos para ser utilizados por los usuarios de las áreas involucradas en los procesos de Seguros Constitución C.A.

2. Es responsabilidad de los usuarios de las áreas involucradas en los procesos el manejo y cumplimiento de la información suministrada, a través de los manuales de normas y procedimientos, dentro de la organización.

3. Los Usuarios de las áreas involucradas en los procesos que manejan la información reflejada en los manuales de normas y procedimientos, son responsables de velar que la información allí contenida no sea revelada ni publicada a ninguna fuente externa, ya que podrían exponer la operatividad de la empresa Seguros Constitución C.A.

POLITICAS

Política # 1

El proceso de Gestión de Cambios, regirá todos los cambios tecnológicos de servicios en los aplicativos de la organización e infraestructura física de TI.

Razón/Justificación:

Es necesario hacer énfasis en la utilización de los procesos y procedimientos definidos para lograr las metas de calidad, garantizando el éxito del proceso de la Gestión de Cambios en su totalidad.

Principios:

La utilización del proceso de Gestión de Cambios, es fundamental para garantizar el éxito de todo cambio de la infraestructura de TI.

Implicaciones:

- Divulgar el proceso de Gestión de Cambios a todo el personal del área de Tecnología de la Información y áreas involucradas a niveles organizacionales relacionados con el mismo.
- Concientizar a todo el personal, sobre la implantación y cumplimiento del proceso de Gestión de Cambios.

- Contar con la capacidad de recursos tecnológicos, de procesos y humanos calificados (incluyendo todas las áreas involucradas en el cambio), para garantizar la aplicación del proceso de administración del cambio.

- Los RFC's deben estar diligenciados con toda la información técnica y del servicio/negocio, regulatoria necesaria y exigida, con el fin de realizar el proceso de Gestión de Cambio.

- El Iniciador del Cambio debe elaborar el RFC de acuerdo al tipo de cambio, y acompañado por la solicitud suscrita por el área.
  Nota: Los RFC's y soportes deben ser resguardados en la carpeta compartida de Gestión de la demanda de forma digital.

Beneficios:

- Se estandarizan los procesos de Gestión de Cambios, con el fin de soportar eficientemente el negocio.
- Se mejoran los tiempos de atención y de espera de las solicitudes.
- Se facilita el control, registro y capacidad de seguimiento por estado de los Cambios, lo que permite mantener oportunamente informado a la Organización de la solicitud.
- Se formalizan los canales de comunicación hacia las áreas involucradas en el cambio.

Personal a quien va dirigida:

- Todo el personal de TI y demás área involucradas.

Consecuencia de no seguirla:

- Pérdida de control sobre los cambios realizados sobre la infraestructura de TI, incrementando el riesgo de impacto sobre otros elementos de la infraestructura.
- No aprobación de los cambios por incumplimiento o desviaciones en el proceso de Gestión de Cambios.
- No se garantiza el éxito en la satisfacción de la Organización.
- Incumplimiento de normativas internas.
- Afectación en los Servicios de TI e incluyendo a los de Negocios.

Excepciones:

No Aplica.

Política # 2

Todo cambio de “Emergencia”, tiene que estar debidamente justificado y documentado, indicando los servicios afectados.

Razón/Justificación:

- Permitir la atención inmediata de la misma.

Principios:

- Los cambios de “Emergencia”, deben ser gestionados para reaccionar ante la pérdida o degradación de un servicio.
- Se debe minimizar el impacto del cambio y restaurar el servicio lo antes posible.

Implicaciones:

- Las justificaciones del cambio deben mencionar explícitamente si existen servicios adicionales expuestos a ese cambio.
- Disponer de los criterios para determinar cuándo un cambio es urgente.
- Integrar y acelerar las actividades de asignación del cambio urgente.
- Dar un seguimiento a la implantación.
- Analizar si el cambio es definitivo o requiere de ajustes posteriores.

Beneficios:

- Todo cambio es debidamente justificado.
- Se disminuyen los cambios urgentes.
- Se adquiere conocimiento especializado para cambios similares en el futuro.
- Se logra confianza/madurez en el proceso desarrollado.

Personal a quien va dirigido:

- Todo el personal de TI y demás áreas involucradas.

Consecuencia de no seguirla:

- Si la justificación es deficiente, no se tratará esta solicitud con la urgencia requerida.
- Incremento de las solicitudes de cambio urgentes.

Excepciones:

No aplica.

Política # 3 (Aprobación)

Todo RFC se debe regir por los siguientes niveles aprobatorios, de acuerdo al nivel de impacto y prioridad definido por el Iniciador del Cambio (solicitante): **URGENCIA /IMPACTO**	**ALTO**	**MEDIO**	**BAJO**
URGENTE	Comité Ejecutivo de Cambios (CEC)	Comité de Cambios (CC)	Comité de Cambios (CC)
NO URGENTE	Comité Ejecutivo de Cambios (CEC)	Comité de Cambios (CC)	Comité de Cambios (CC)

Razón/Justificación:

- Disponer de un estándar para la aprobación de los cambios.

Principios:

- Establecer un esquema único de aprobación para todos los cambios.
- Las solicitudes de cambio deben ser revisadas y escaladas por el nivel aprobatorio en la tabla según el proceso.

Implicaciones:

- El RFC debe indicar y justificar el impacto y la urgencia del cambio, de acuerdo a los parámetros establecidos.
- Todas las personas que pueden iniciar un cambio deben conocer los parámetros vigentes a utilizar para determinar la urgencia y el impacto.
- Gestión de Cambios y el Comité de Cambios (CC), tendrán los niveles de competencia y autoridad suficientes para aprobar o rechazar cambios, de acuerdo a lo establecido en el proceso de Gestión de Cambios, buscando el balance entre el riesgo organizacional y las necesidades del negocio.

Beneficios:

- Se establece claramente cuáles son los niveles de aprobación.
- La definición del impacto y urgencia de un cambio, sirve de guía para la determinación de estos atributos en un cambio.
- La categorización temprana y apropiada del cambio, puede agilizar el flujo del proceso.

Personal a que va Dirigida:

- Todo el personal de TI y demás áreas involucradas.

Consecuencias de no Seguirla:

- El tiempo de aprobación y aplicación del cambio puede verse afectado.

Excepciones:

- Esta política no aplica para los cambios de tipo “Estándar” (debido a que son pre-aprobados) y “Emergencia” de Medio y Bajo Impacto.

Política
#4

La documentación del plan de reverso (*roll back*) es obligatoria para la aprobación de cualquier cambio. Mientras que la documentación del plan de contingencia, es exigido, para los cambios de alto impacto.

Razón/Justificación:

- Todo RFC debe contener información acerca de la forma en que se debe responder ante una contingencia durante el cambio.

Principios:

- Asegurar la continuidad del servicio prestado, aun cuando el cambio implementado no fue exitoso.
- La recuperación de la operatividad en el menor tiempo posible, por causas de fallas no esperadas.

Implicaciones:

- Se requiere mayor detalle en la documentación de los procesos y procedimientos para la ejecución del cambio.

- La planificación de recursos necesarios (horas, personal, etc.) para la implantación de los planes de reverso (*roll back*).

Beneficios:

- Disminuir los reversos improvisados que pueden llevar a resultados no esperados.
- Mejorar la planificación de los cambios.

Consecuencia de no seguirla:

- De no presentar la documentación del plan de reverso para cualquier cambio y el plan de contingencia para los casos de alto impacto, no se autorizará el cambio.
- Posibles errores.

Personal al quien va dirigida:

- A todos los roles involucrado en el proceso.

Excepciones:

No aplica.

Política # 5

Todo cambio que involucre un *Roll Out* (distribución masiva) tendrá que incluir en el RFC el plan de distribución y los procedimientos debidamente revisados y probados.

Razón/Justificación:

- Asegurar que el RFC contenga toda la información necesaria para maximizar la posibilidad de éxito de la implantación.

Principios:

- La correcta implantación de un cambio depende de una adecuada documentación, procedimientos y plan de distribución.

Implicaciones:

- Los cambios deben ser planeados y construidos con su respectivo plan de distribución, procedimientos y documentación.

Beneficios:

- Se minimizan los riesgos de falla al implementar y distribuir un cambio.
- Se logra mayor confiabilidad de los cambios a implementar.
- Los cambios cuentan con apoyos sólidos que respaldarán una implantación más confiable.

Personal a quien va dirigida:

- Gestión de Cambios.
- Proveedor de Servicios.

Consecuencia de no seguirla:

- Aumenta el riesgo de que un cambio no se implante o distribuya en forma apropiada.

Excepciones:

No aplica.

Política # 6

Todo cambio de alto impacto, debe ser informado al SIU y las demás áreas de Tecnología dependiendo el área afectada.

*Razón/Justificación***:**

- Asegurar que otras áreas de gestión estén suficientemente informadas con previa antelación sobre los cambios a ser efectuados.

Principios:

- Contribuir con la comunicación entre los distintos procesos para la administración de los servicios de TI.

*Implicaciones***:**

- Contar con medios de notificación formales y bien establecidos.

Beneficios:

- El SIU y las áreas que competan, estarán preparados ante cualquier eventualidad.

Personal a quien va dirigida:

- SIU.
- Áreas Implantadoras.
- Gestión de Cambios.
- Dueño del Proceso.

Consecuencia de no seguirla:

- Desinformación ante alguna eventualidad asociada a los servicios y las Entidades Regulatorias.

Excepciones:

No aplica.

Política # 7

La implementación simultánea de dos o más cambios que afecten un mismo servicio y/o Infraestructura de TI, estará sometida a evaluación.

Razón/Justificación:

- Controlar individualmente las diferentes variables que puedan afectar al servicio ante cambios simultáneos en diferentes Elementos de Configuración asociados a un mismo servicio.

Principios:

- Segregar el impacto en el servicio del cambio en cada uno de los Elementos de Configuración.

Implicaciones:

- Se tienen que reprogramar los cambios que entren en conflicto.

Beneficios:

- Se reducen los riesgos de problemas durante o después de la implantación de los cambios que puedan afectar negativamente la disponibilidad del servicio.
- Se facilita la detección del origen de posibles problemas durante o después de la implantación de un cambio.

Personal a quien va dirigida:

- Comité de Cambios (CC).
- Gestión de Cambios.
- Iniciador del Cambio (área solicitante del cambio).

Consecuencia de no seguirla:

- Aumento de probabilidad de fallas.
- Se dificulta el diagnóstico de problemas.
- Se dificulta la resolución de la falla.

Excepciones:

No aplica.

Política # 8

Los Proveedores Externos solo podrán proponer cambios, a través de Iniciadores del Cambio (área solicitante del cambio) dentro de las áreas involucradas, quienes seguirán luego el proceso de Gestión de Cambios.

Razón/Justificación:

- Todo cambio tiene potencialmente la posibilidad de impactar uno o varios servicios, por lo que es importante pasen por el proceso de Gestión de Cambios.

Principios:

- Todo cambio debe pasar por el proceso de Gestión de Cambios.
- La actividad de los proveedores externos puede impactar la calidad comprometida de los servicios.

Implicaciones:

- Se debe nombrar una persona que tenga el rol de Iniciador del Cambio (área solicitante del cambio) y que sirva de canal con el proveedor externo.
- El proveedor externo debe comprometerse a no realizar cambios que no sean tramitados por el Iniciador del Cambio (área solicitante del cambio) y aprobados por el proceso de Gestión de Cambios.

Beneficios:

- Se tiene un mayor control de los cambios en la infraestructura de TI.
- No se aprueban los cambios realizados por proveedores externos que no hayan seguido el proceso.
- Alinear a los proveedores con las políticas y procesos de Gestión de Cambios de TI.

Personal a quien va dirigida:

- Proveedores externos.
- Iniciador del Cambio (área solicitante del cambio).
- Comité de Cambios (CC).

Consecuencia de no seguirla:

- Realizar cambios que no tengan en cuenta el contexto de niveles de servicio comprometidos, poniendo en peligro el cumplimiento de los mismos.

Excepciones:

No aplica.

Política # 9

Toda solicitud de cambio, donde sea necesaria la presencia del Proveedor Externo, debe notificarse con un mínimo 72 horas de anticipación y para el seguimiento Post Producción se debe contar con la asistencia de dicho Proveedor por un período de 72 horas posteriores a la aplicación del mismo o en su defecto contar con los mecanismos de soporte que aseguren la continuidad y soporte del servicio.

Razón/Justificación:

- Garantizar la atención oportuna de las posibles incidencias ocasionadas por la implementación del cambio.

Principios:

- La actividad de los Proveedores Externos, pueden impactar la calidad y continuidad de los servicios.
- Toda Solicitud de Cambio, debe cumplir con las normas y políticas del proceso de Gestión de Cambios.

- Es necesario comprometer al Proveedor, con la calidad de la entrega e implementación de sus Productos.

Implicaciones:

- El iniciador del cambio (área solicitante del cambio), debe garantizar la presencia en sitio, para el soporte Post Implementación.
- Puede verse afectada la continuidad del servicio impactado.

Beneficios:

- Atención oportuna y rápida, ante cualquier incidencia o falla que se presente.
- Contar con el conocimiento especializado del Proveedor, en sitio.
- Alinear a los Proveedores, con las políticas del Proceso de Gestión de Cambios.

Personal a quien va dirigida:

- Proveedores Externos.
- Iniciadores de Cambios (área solicitante del cambio).
- Comité de Cambios (CC).

Consecuencia de no seguirla:

- Afectar severamente los acuerdos de servicio comprometidos.
- Inversión de un tiempo considerable en la resolución del problema/incidente.

Excepciones:

- Solo aplica si la permanencia del Proveedor Externo, genera un gasto oneroso para la Organización o se determina que es viable su asistencia de forma remota.

Política # 10

Las sesiones del Comité de Cambios (CC), se efectuarán a criterio del Asesor de Gestión de Cambios en base a la cantidad de solicitudes de Cambio IT (RFC) que existan (su celebración estará sujeta a emisión de propuestas).

Razón/Justificación:

- Dar continuidad a las sesiones del Comité de Cambios (CC).

Principios:

- Establecer esquemas de continuidad del Comité de Cambios (CC).

Implicaciones:

- Deben tomarse todas las consideraciones previas a estas fechas, para la planificación de las sesiones del Comité de Cambios (CC).
- Debe entregarse la planificación estimada de los cambios, según el proceso establecido.
- Re-planificar las sesiones del Comité de Cambios (CC), según calendario festivo o bancario.

Beneficios:

- Garantizar la continuidad en la planificación de los cambios.

Personal a quien va dirigida:

- Iniciadores de Cambios (área solicitante del cambio).
- Usuarios Funcionales.
- Comité de Cambios (CC).

Consecuencia de no seguirla:

- Detener la planificación de la implementación de cambios.
- Comprometer los acuerdos alcanzados con el negocio y los usuarios.
- Afectar los tiempos de implementación de cambios.

Excepciones:

No aplica.

Política # 11

Los cambios de Emergencia de Alto Impacto deben ser ejecutados, una vez discutidos en el Comité de Cambios de Emergencia (CCE) y autorizados por cada uno de los involucrados.

Razón/Justificación:

- Solventar y dar continuidad al negocio.

Principios:

- Establecer mecanismos de seguridad y autorización.

Implicaciones:

- Se debe discutir el cambio en el Comité de Cambios de Emergencia (CCE).
- Debe accionarse de inmediato, una vez autorizado.

Beneficios:

- Garantizar la continuidad del negocio.

Personal a quien va dirigida:

- Iniciadores de Cambios (área solicitante del cambio).
- Comité de Cambios de Emergencia (CCE).

Consecuencia de no seguirla:

- Comprometer los acuerdos alcanzados con el Comité de Cambios de Emergencia (CCE).
- Afectar la continuidad del negocio.

Excepciones:

No aplica.

Normas Generales para la Gestión de Cambios

Para la Gestión de Cambios se establecen unas normas generales por las cuales debe regirse cualquier Jefatura de Seguros Constitución que necesite ejecutar el Proceso de Gestión de Cambios:

1. Llenar la Planilla de Solicitud de Cambio IT en todas sus partes al momento de solicitar una Gestión de Cambio IT, de forma alineada a las Reglas de Negocio (Ver Anexo 10 de este documento). Para visualizar los detalles de los Criterios de Clasificación de los Controles de Cambio (Ver Anexo 11 de este documento).
2. De acuerdo al tipo de Solicitud de Cambio el Área Solicitante o Iniciador de Cambio debe anexar a las áreas involucradas la documentación correspondiente a la solicitud:
   - Tipo de Cambio “Requerimiento”: Solicitud de Gestión de Requerimiento, Solicitud de Requerimiento, además de llenar la Solicitud de cambio IT en todos los campos correspondiente y colocar en los campos “Objetivo” e “Impacto” la siguiente observación: “Remitirse al documento de Requerimiento”.
   - Tipo de Cambio “incidencia”: Debe llenar la Solicitud de cambio IT en todos los campos correspondiente incluyendo un detalle descriptivo en los campos “Objetivo” e “Impacto”.
3. El Área Solicitante o Iniciador de Cambio debe solicitar al Área Implantadora (Gerencia de Tecnología: Base de Datos o Servidores, según el tipo de cambio solicitado) las trazas de rendimiento (Estudio de Impacto) sobre todo cambio que involucre la modificación de código u objeto de Oracle.

4. El Área Implantadora (Gerencia de Tecnología: Base de Datos o Servidores, según el tipo de cambio solicitado) es responsable de establecer si la solicitud de Estudio de Impacto amerita o no según su criterio de análisis del tipo de cambio solicitado.

5. El Área Implantadora (Gerencia de Tecnología: Base de Datos o Servidores, según el tipo de cambio solicitado) es el responsable de informar vía correo electrónico a la Gerencia de Seguridad de la Información y a las áreas involucradas si fue efectuado o no el estudio solicitado, y del resultado del mismo en caso de ser efectuado.
6. Documentar y pre-aprobar los procedimientos para los cambios de tipo estándar, a fin de agilizar su gestión y mejorar los tiempos de respuesta.
7. Registrar los cambios asociados a las incidencias como tipo de “Cambio de Emergencia”.
8. Evaluar los cambios de emergencia de alto impacto, a través del Comité de Cambios de Emergencia (CCE).
9. Evaluar, junto con las unidades de control la factibilidad de los cambios planificados (Comité de Control de Cambios), siempre y cuando hubiese solicitudes o propuestas.
10. Notificar los cambios de alto impacto (Requerimientos / Proyectos) con dos (2) semanas mínimo de anticipación, a fin de analizar y discutir en reunión interna con integrantes de la Vicepresidencia de Tecnología de la Información y posteriormente presentarlos en Comité Ejecutivo de Cambios (CEC). Asimismo, estos cambios deben tener al momento de la reunión, una presentación que muestre la línea de tiempo y la planificación respectiva del pase a producción.
11. Notificar los cambios relacionados con proveedores, en la reunión de Comité de Cambios (CC) próxima siguiente, previa a la fecha de su implementación.
12. Notificar los cambios regulatorios/mandatorios (solicitados vía Gaceta o Informe Oficial), una vez conocida la información, indicando la fecha requerida por el ente regulador, de la puesta en producción. Cabe destacar, que si la fecha de la Gaceta o Informe Oficial, es cercana a la fecha de puesta en producción, dicha Solicitud de Cambio IT debe tener “Origen de Cambio”: regulatorio, “Tipo de Origen”: requerimiento y “Tipo de Cambio”: emergencia.

13. Revisar, todo cambio que pueda afectar los distintos cierres o procesos de Acsel/x (Diario, Mensual, Anual).
14. Establecer a los solicitantes de cambios, que deben gestionar las certificaciones respectivas, con las unidades involucradas y posteriormente adjuntarlas a la Solicitud de Cambio IT.
15. Certificar los cambios según su origen, por los equipos que correspondan:

ORIGEN DEL CAMBIO	SECCIÓN CERTIFICADORA
INCIDENTE	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
REQUERIMIENTO	GESTIÓN DE CAMBIOS
ESTÁNDAR	
PROYECTOS DE SISTEMAS	TECNOLOGÍA/ SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
PROYECTOS TECNOLÓGICOS	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

16. Realizar todas las pruebas en ambiente de desarrollo, para los casos de sistemas que no adopten el esquema de tres (3) ambientes: “Desarrollo, Calidad y Producción, una vez certificadas, se debe ejecutar el cambio en Ambiente de Producción.
17. Respaldar a través de una Solicitud de Cambio IT de tipo Estándar, con origen de Gestión de Cambios, las restauraciones de Producción a Desarrollo, asimismo, esta Solicitud de Cambio IT (RFC) debe tener adjunta la autorización del Gerente del

Iniciador del Cambio (área solicitante del cambio) y Gerencia de Seguridad de la Información así como adjuntar la información requerida (Ver Anexo 12 de este documento).

18. Respaldar con una Solicitud de Cambio IT, toda afectación a Bases de Datos, que involucren sentencias, tales como: *Delete, Insert* o *Update*.
19. Manejar los cambios de INTRANET los cuales no tengan afectación en el código, a través de una solicitud o reporte en el SIU, agregando las órdenes de Trabajo o tickets que correspondan, a cada una de las unidades implantadoras.
20. Solicitar los cambios de INTRANET que contengan afectación en el código, a través de una Solicitud de Cambio IT.
21. Los implantadores que requieran reversar un cambio, deben seguir el orden indicado por el Iniciador de Cambios (área solicitante del cambio). Sin embargo, deben realizarse las instrucciones detalladas en la Solicitud de Cambio IT.

I. Conceptualización y Bases Teóricas

1. Gestión de Cambios

Proceso en el cual se deben evaluar los cambios, planificar y coordinar su implementación, y cerrar después de aplicación en producción, independientemente del tipo de cierre (Cancelado, Rechazado, Fallido o Exitoso). El objetivo, es asegurar que se cumpla de forma eficiente, y asegurando la calidad y continuidad de los Servicios de TI.

El beneficio que ofrece dicha gestión, está basado en los siguientes puntos:

- Desarrollar procedimientos de cambio estándar, los cuales permiten la rápida actualización de sistemas de baja criticidad.
- Reducir la cantidad de incidentes y problemas.
- Reducir la cantidad de recuperaciones o Roll Back.

- Retornar a configuraciones estables de forma sencilla y rápida, en caso de requerir reversar el cambio, debido a un impacto negativo sobre la Infraestructura de TI o del Negocio.

Funciones de Gestión de Cambio

- Velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en este Manual.
- Verificar que las peticiones de cambio en la Infraestructura Tecnológica, estén justificadas por uno de los siguientes puntos:
    - Corrección de errores.
    - Innovación y mejora de los servicios.
    - Cumplimiento de Normativas Regulatorias.
    - Mantenimiento Preventivo / Correctivo:
        a. Revisar el llenado de los RFC's.
        b. Controlar que contengan los archivos anexos requeridos, según las tablas siguientes:

"CAMBIOS TÉCNICOS" DOCUMENTOS A ENTREGAR	PROYECTO/REQUERIMIENTO ALTO IMPACTO	EMRGENCIA ALTO IMPACTO	EMERGENCIA BAJO Y MEDIO IMPACTO	PROYECTO PLANIFICADO BAJO Y MEDIO IMPACTO	REQUERIMIENTO PLANIFICADO BAJO Y MEDIO IMPACTO	ESTANDAR BAJO Y MEDIO IMPACTO
SOPORTE DEL CAMBIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (RFC's de Seguridad)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CERTIFICACIÓN DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PLAN DE CONTINGENCIA	SI	SI	-	-	-	-
PLAN DE ACTIVIDADES (GANTT)	SI	-	-	SI	-	-
LÍNEA DE TIEMPO	SI	-	-	SI		-
AUTORIZACIÓN COMITÉ ALTO IMPACTO	SI	-	-	-	-	-
AUTORIZACIÓN COMITÉ EMERGENCIA	-	SI	-	-	-	-

(*) Aplica únicamente para aquellas aplicaciones que tienen ambiente de Calidad. En caso de no poseer ambiente de Calidad, las pruebas deben hacerse en ambiente de Desarrollo. (**) Aplica únicamente para aquellas aplicaciones nuevas.

"CAMBIOS EN SISTEMAS" DOCUMENTOS A ENTREGAR	PROYECTO/REQUERIMIENTO ALTO IMPACTO	EMERGENCIA ALTO IMPACTO	EMERGENCIA BAJO y MEDIO IMPACTO	PROYECTO PLANIFICADO BAJO y MEDIO IMPACTO	REQUERIMIENTO PLANIFICADO BAJO y MEDIO IMPACTO	ESTANDAR BAJO y MEDIO IMPACTO
SOPORTE DEL CAMBIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES AL CÓDIGO	SI	-	-	SI	SI	-
CERTIFICACIÓN USUARIO (PRUEBAS QA) *	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SI	SI	SI	SI	SI	SI
N°. REGISTRO INVESTIGACION TI (Sistemas Nuevos)**	SI	-	-	SI	-	-
PLAN DE CONTINGENCIA	SI	SI	-	-	-	-
PLAN DE ACTIVIDADES (GANTT)	SI	-	-	SI	-	-
LÍNEA DE TIEMPO	SI	-	-	SI	-	-
AUTORIZACIÓN COMITÉ ALTO IMPACTO	SI	-	-	-	-	-
AUTORIZACIÓN COMITÉ EMERGENCIA	-	SI	-	-	-	-

- Coordinar y planificar la implementación de cambios.
- Conjuntamente con las unidades de control evaluar la factibilidad de los cambios planificados.
- Evaluar con las distintas unidades de control, los cambios Planificados que demandan los proyectos y requerimientos en el ambiente de Producción, así como para el mantenimiento de la infraestructura de TI existente, a fin de evaluar la factibilidad de ejecución de los mismos, destacando que es necesario medir el impacto que cada caso pueda generar sobre la continuidad operativa del negocio, así como los servicios afectados.
- Evaluar el impacto de los posibles cambios sobre la Infraestructura de TI, el cual permite asegurar que satisfaga las necesidades del Servicio TI.
- Acordar en el Comité de Cambios (CC) y en conjunto con los implantadores, iniciadores de cambios y usuarios funcionales, el momento oportuno para su implantación en Ambiente de Producción, tomando en cuenta que pueden requerir alcanzar determinadas condiciones previas antes de proceder a su implementación, o deben esperar a ser ejecutados en un momento determinado.
- Al finalizar la reunión del Comité de Cambios (CC), debe enviarse la minuta detallada de la planificación de los cambios que se ejecutarán en la semana en curso. Cabe destacar, que dicho comunicado, se envía a los asistentes a la reunión incluyendo los usuarios funcionales y se le copia a todos los Gerentes de Tecnología de la información. Asimismo, diariamente se enviará el estatus de dichos cambios sobre la planificación efectuada, a fin de mantener la comunicación sobre posibles interrupciones en los servicios.
- Convocar y coordinar el Comité de Cambios de Emergencia (CCE), a fin de analizar los cambios de emergencia de alto impacto y poder así planificar su ejecución.
- Convocar y coordinar el Comité Ejecutivo de Cambios (CEC), en caso de cambios de Alto Impacto, para poder realizar un estudio de factibilidad y planificar su ejecución, considerando que previamente, debe ser convocada una reunión interna en el área de Tecnología, para evaluar dicho cambio.

- Emitir las minutas de los cambios de Alto Impacto, previamente autorizados bien sea en un Comité de Cambios de Emergencia (CCE), como en un Comité Ejecutivo de Cambios (CEC).
- Revisar que exista para cambios de alto impacto, el "Punto Obligatorio de Roll Back". Cabe destacar, que este punto es aquel que establece el momento a partir del cual, la duración de un Reverso impacta al Negocio, porque afecta parcial o totalmente su operación.
- Proceder al cierre del cambio.
- Elaborar Informes Estadísticos periódicos, que permitan evaluar el rendimiento de la Gestión de Cambios.
- Enviar el comunicado del período de Black Out, a mediados del mes de Noviembre.

Nota: En caso que el cambio aplicado afecte un servicio o componente de la Infraestructura Tecnológica, se tendrá la autoridad de detener la ejecución de un cambio o aplicar reverso del mismo, siempre y cuando dicha decisión sea previamente tomada en consenso con los Gerentes involucrados y/o afectados.

2. Comité de Cambios (CC)

Equipo multidisciplinario, el cual se encarga de revisar y planificar las solicitudes de cambios planificados.

FUNCIONES:

- Suministrar asesoramiento acerca de las solicitudes de cambio, es decir, realizar recomendaciones y apoyar o rechazar la ejecución de los cambios, teniendo en cuenta el impacto al negocio.
- Evaluar, planificar y coordinar los "Cambios de Tipo Planificado", bien sean de bajo o medio impacto.
- Sugerir y establecer mesas técnicas de trabajo, para la implementación de cambios complejos.

- Verificar la adecuada categorización, evaluación y descripción de los impactos que conllevan los cambios.

Dicho comité debe estar conformado por: **ROL**	**GERENCIA**	**ASISTENCIA**
Iniciador de Cambios	Gerencias de Tecnología	Variable

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

- Para el funcionamiento del Comité de Cambios (CC), no se establece una reunión ordinaria semanal, la cual está sujeta a la existencia de solicitudes, y tendrán una duración aproximada de una hora. Cabe destacar, esta reunión debe ser realizada en día (siempre y cuando existan solicitudes).
- En caso de ser necesario, el Comité de Cambios podrá solicitar la presencia de un proveedor para asegurar la evaluación y planificación del cambio.
- Es importante señalar que el Personal Supervisorio, debe estar representado por una (1) persona de cada gerencia (como se indica en la tabla anterior), bien sea el integrante fijo o el suplente.

3. Comité Ejecutivo de Cambios (CEC)

Para la activación de dicho Comité, el solicitante del cambio debe exponer el detalle de las actividades, la línea de tiempo, riesgos y mitigaciones, beneficios y estrategias a ser consideradas, a fin de evaluar el mismo y poder ser presentado posteriormente al Comité Ejecutivo de Cambios, donde se expondrán todos los detalles indicados anteriormente, al equipo de Gerentes relacionados

o afectados con el cambio, junto con personal de las Unidades de Control y del área implantadora, así como al encargado de la Gestión de Cambio.

FUNCIONES:

- Evaluar y planificar los cambios de “Alto Impacto”.
- Establecer estrategias para el antes, durante y después del cambio.
- Enviar minuta que autoriza dicho cambio.
- Verificar y emitir alertas cuando los mismos comprometan la integridad de los sistemas involucrados.

ESTRUCTURA PRE-COMITÉ TECNOLÓGICO

ROL	ASISTENTES	ASISTENCIA
Iniciador de Cambios	Gerencias de Tecnología	Deseable
Evaluadores y Autorizadores de Cambios	Área Tecnología de la Información	Fija
Gerente Gestión de la Demanda		Fija
Gerente de Tecnología		Fija
Gerente de Sistemas		Fija
Gerente de Proyectos y Procesos		Fija
Asesor de Gestión de Cambios		Fija

ESTRUCTURA CEC

ROL	ASISTENTES	ASISTENCIA
Iniciador de Cambios	Gerencias de Tecnología	Fija
valuadores e Implantadores	Base de Datos / Servidores	Variable

ROL	ASISTENTES	ASISTENCIA
Autorizadores de Cambios	Area Tecnología de la Information	Fija
Gerencia Gestión de la Demanda		Fija
Gerencia Seguridad de la Información		Fija
Gerencia Tecnología		Fija
Gerencia de Sistemas		Fija
Asesor Gestión de Cambios		Fija
Gerencia a la cual corresponde el Iniciador del Cambio		Fija
Administrador de Incidentes, Requerimientos y/o Problemas	Soporte Integral Usuario	Variable

CONSIDERACIONES ESPECIALES

La intención es asegurar que la composición del CEC sea flexible, de manera de representar los intereses del negocio en forma apropiada, así como las áreas técnicas cuando se proponen cambios complejos en todo momento y eventualidad.

4. Comité de Cambios de Emergencia de Alto Impacto (CCE)

Equipo multidisciplinario, quien junto al Asesor de Gestión de Cambio y representantes del área solicitante, se encargan de hacer un estudio de factibilidad del cambio, para luego planificar la solicitud de cambio (su conformación está basada en los Gerentes y el Vicepresidente de Tecnología, así como aquellas Gerencias que tengan injerencia con el cambio presentado).

FUNCIONES:

- Un representante de Gestión de Cambios, debe realizar de forma inmediata una evaluación preliminar con el solicitante del cambio, a fin de determinar los miembros que son necesarios para la aprobación del mismo.
- Contactar a los integrantes del Comité de Cambios de Emergencia (CCE), a fin de discutir, certificar y planificar la implementación del cambio.
- Enviar minuta que autoriza el cambio.

ESTRUCTURA: ROL	GERENCIA	ASISTENCIA
Usuario Solicitante.	Personal del negocio involucrado con dicho cambio.	Variable
Iniciador de Cambios.	Solicitante del Cambio.	Variable
Evaluadores y Autorizadores de Cambios.	Gestión de Cambios / Seguridad de la Información	Fija
Gerente de Seguridad de la Información.		Fija
Gerente de Tecnología.		Fija
Gerente al cual corresponde el Iniciador del cambio.		Fija

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

- La Gerencia que reciba el reporte de la emergencia de Alto Impacto, debe notificar, vía correo electrónico, telefónica o personalmente, la ocurrencia de cualquier incidencia que afecte o degrade un servicio de negocio en Producción.
- En caso de ser necesario, debe ser convocado un representante de las áreas de negocio impactadas por el cambio o cuando la suspensión del servicio requiera la aprobación de las mismas.
- Si la emergencia de Alto Impacto, se presenta en horas laborales la convocatoria se debe realizar de forma presencial.
- Si la emergencia se presenta en días no laborables o en horario posterior a la 5:00 PM, la convocatoria se debe realizar mediante llamada telefónica en conferencia con los miembros según se indica en tabla anterior, y finalmente se solicita la autorización vía correo electrónico.

Cabe destacar, que las autorizaciones vía correo electrónico, deben ser realizadas por los Autorizadores de Cambios.

5. Indicadores y Métricas

Emitir Informes periódicos, según la tabla que se muestra a continuación:

MÉTRICAS	DESCRIPCIÓN	SEMANAL	MENSUAL	ANUAL	DISTRIBUCIÓN
1. Cantidad RFC's requeridos por Gerencia Iniciadora.	Provee un indicador, de la cantidad de RFC's solicitados por cada Gerencia.	X	X		
2. Cantidad de RFC's por Tipo de Cierre.	Provee indicadores, de la cantidad de cambios que fueron cerrados Exitosos, Cancelados y/o Fallidos.	X	X	X	
3. Cantidad de RFC's en proceso de implantación.	Provee indicadores, de la cantidad de cambios que están siendo implantados en producción.	X	X	X	
4. Cantidad de RFC's en Post Producción.	Provee indicadores, de la cantidad de cambios que se encuentran en Post Producción.	X	X	X	

5. Cantidad de RFC's por Tipo de Cambio.	Provee indicadores, de la cantidad de RFC's clasificados por Tipo de Cambio, tal como: Planificado, Estándar y/o Emergencia.	X	X	X	GERENCIA GESTIÓN DE LA DEMANDA
6. Cantidad de RFC's por Gerencia, en cumplimiento e incumplimiento.	Provee indicadores, de la cantidad de RFC's por Gerencia, que tienen toda la documentación requerida, según el cambio y los que no.	X	X	X	
7. Cantidad de RFC's procesados en el mes.	Provee indicadores, de la cantidad total de RFC's procesados.	X	X	X	

INFORMES	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	DISTRIBUCIÓN
1. RFC's por Tipo de Cambio, por Gerencia Iniciadora.	Provee el detalle por gerencia, de los RFC's clasificados por Tipo de Cambio, tal como: Estándar y/o Emergencia.	SEMANAL	GERENTES UNIDADES SOLICITANTES
2. Minuta de Cambios Planificados.	Provee el detalle de los RFC's que se planifican para ser implantados en la semana misma que se realiza el Comité de Cambios.	SEMANAL	TODOS LOS INVOLUCRADOS EN EL COMITÉ DE CAMBIOS

6. Roles y Responsabilidades

ROLES	RESPONSABILIDADES
INICIADOR DE CAMBIOS (IC)	- Registrar los RFC's. - Solicitar autorización para la ejecución de dicho cambio. - Ajustar los RFC's en caso de observaciones. - Presenciar la ejecución del cambio.
AUTORIZADORES (Gerentes / CC / CEC / CCE)	- Revisar los RFC's. - Autorizar su aplicación en producción.
ASESOR DE CAMBIOS	- Revisar los RFC's. - Informar rechazo del cambio, en caso de aplicar. - Convocar reuniones y comités de alto impacto.

ASESOR DE CAMBIOS	Revisar los RFC's. Coordinar la fecha y hora para la implantación del cambio, en consenso con los Implantadores y usuarios funcionales. Informar rechazo del cambio, en caso de aplicar. Realizar seguimiento a todo el ciclo de vida del cambio. Convocar los comités de cambios y los de emergencia. Cerrar los RFC's.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Revisar los RFC's. Realizar un análisis de factibilidad e impacto, para la ejecución del cambio. Autorizar o rechazar los cambios a ser implantados en Producción.
IMPLANTADORES	Revisar RFC a ser implantado. Documentar las observaciones relacionadas con el cambio. Implantar el cambio en Producción. Proporcionar la información necesaria sobre la ejecución del cambio.
COMITÉ DE CAMBIOS (CC)	Acordar la fecha y hora de ejecución de los cambios. planificados, de bajo y medio
COMITÉ EJECUTIVO DE CAMBIOS (CEC)	Validar el Riesgo e Impacto a las áreas involucradas. Autorizar la implantación del cambio. Planificar el cambio.
COMITÉ DE CAMBIOS DE EMERGENCIA (CCE)	Evaluar el porqué de la Emergencia. Realizar un Estudio de Factibilidad. Autorizar la implantación del cambio. Planificar el cambio.

II. Desarrollo de Procesos

1. Macro Proceso para Gestionar Control de Cambio

1.1 Objetivo y Alcance del Macro Proceso.

Objetivo: Realizar las instrucciones establecidas para la ejecución de los procesos pertenecientes al macro para proceso Gestionar Control de Cambio, para las modificaciones en el ambiente de producción.

Alcance: Recepción de todas las solicitudes a través de la planilla de Solicitud de Cambio IT (RFC) debidamente llenadas, para la implantación del cambio.

1.2. Normativa del Macro proceso.

1.2.1. De las Unidades Solicitantes

1.2.1.1. Llenar las Solicitudes de Cambio IT (RFC), a través del formato establecido de forma alineada a las Reglas de Negocio (Ver Anexo 14 de este documento).

1.2.1.2. Establecer que los solicitantes de cambios, deben gestionar las certificaciones respectivas, con las unidades involucradas y posteriormente adjuntarlas a la Solicitud de Cambio IT correspondiente (RFC).

2. Proceso para Registrar Solicitudes de Control de Cambio

2.1 Objetivo, Alcance y Frecuencia del Proceso

Objetivo: Llenar el formato de Solicitud de Cambio IT (RFC), con la finalidad de evaluar y ejecutar el control de cambio solicitado al Asesor de Gestión de Cambios.

Alcance: La solicitud o el llenado de la Solicitud de Cambio IT (RFC), debe ejecutarse cuando se requiera realizar creaciones o modificaciones dentro del ambiente de producción y con previa pre-aprobación del requerimiento o incidencia.

Frecuencia: Cada vez que las unidades solicitantes generen un control de cambio.

2.2. Normas Específicas

2.2.1. Del Iniciador de Cambio (Solicitante)

a. Llenar los RFC, todas las Gerencias iniciadoras de cambios, a través del formato establecido de forma alineada a las Reglas de Negocio (Ver Anexo 10 de este documento).
b. Establecer que los solicitantes de cambios, deben gestionar las certificaciones respectivas, con las unidades involucradas y posteriormente adjuntarlas al RFC.
c. Solicitar los cambios de INTRANET que contengan afectación en el código, a través de una Solicitud de Cambio IT al asesor de Gestión de Cambios.

2.2.2. Del Asesor de Gestión de Cambio.

a. Revisar el contenido de la Solicitud de Cambio IT (RFC) y sus anexos.
b. Coordinar las pruebas en Ambiente de QA con el usuario y una vez certificadas, solicitar la autorización para ejecutar el Cambio en Ambiente de Producción, para los casos de sistemas enlazados con “Entes Externos” los cuales no adopten el esquema de tres (3) ambientes: desarrollo, calidad y producción, debe tomar las medidas para mitigar los riesgos asociados.
c. Responder oportunamente al solicitante con el detalle del estatus de la solicitud.

2.3. Entradas y Salidas del Proceso.

Entradas: Solicitud de Cambio IT indicando las instrucciones a realizar.

Salidas: La aprobación inicial del registro de la solicitud.

2.4. Descripción del Proceso.

Proceso Para Registrar Solicitudes

Área Solicitante (Iniciador de Cambio)

1. Llena la Solicitud de Cambio IT, una vez que tenga todas las certificaciones de las pruebas y los soportes requeridos para efectuar el pase a producción, debe llenar el Formato “Solicitud de Cambio IT” en todas sus partes.
2. Verifica si es una Solicitud de Cambio IT (RFC) asociada a una “Incidencia” o “Requerimiento”, si el cambio está asociado a una incidencia continúa con el paso 3, en caso contrario continúa con el paso 4 de este procedimiento.
3. Llena los campos “Objetivo” e “Impacto” de la Solicitud de Cambio IT (RFC): “Remitirse al Documento de Requerimiento” y el número de incidencia asociado (número de ticket asignado) por el SIU. Continúa con el paso 5 de este procedimiento.
4. Llena los campos “Objetivo” e “Impacto” de la Solicitud de Cambio IT (RFC) con el detalle descriptivo de la incidencia y el número de requerimiento asociado y número de ticket asignado por el SIU. Continúa con el paso siguiente.
5. Enviar Solicitud de Cambio IT (RFC) vía correo electrónico a Gestión de Cambios con copia a las demás áreas involucradas y al Gerente del Área Solicitante o Iniciador de Cambio, anexando en digital la documentación que corresponda en base al Tipo de Solicitud de Cambio: Formato de Pruebas de Certificación (301-0009-05-0014), Correo Electrónico de Resultados de Estudio de Impacto, Solicitud de Cambio IT (VEN-301- 0009-05-0024) solicitando el pase a Producción.

Asesor de Gestión de Cambio

6. Recibe Solicitud de Cambio IT (RFC) vía correo electrónico acompañada del digital de la documentación correspondiente en base al Tipo de Solicitud de Cambio.
7. Revisa el contenido de la Solicitud de Cambio IT (RFC), verifica que esté llenado correctamente y que los documentos anexos sean los requeridos para el tipo y origen del cambio. Si esta correcto continúa con el paso siguiente, en caso contrario continúa con el paso 9 de este procedimiento.
8. Asigna número de RFC a la solicitud para el Control de Cambio. Se activa el proceso de “Revisar Solicitudes de Control de Cambio”. Fin del proceso.
9. Documenta en el RFC el motivo de rechazo de la Solicitud de Cambio IT.
10. Responde vía correo electrónico al Área Solicitante o Iniciador del Cambio el motivo del rechazo e indicaciones de ajustes. Fin del proceso.

2.5. Actividades de Control.

Actividad	Frecuencia	Responsable	Tipo de Control
Actividad Nº 2 Verifica si es una Solicitud de Cambio IT asociado a Incidencia o Requerimiento.	Cada vez que se llena el RFC.	Iniciador del cambio (Tecnología).	Manual – Preventivo.
Actividad Nº 7 Revisa el contenido de la Solicitud de Cambio IT y anexos.	Se realiza la actividad con cada uno de los RFC’s que reciban	Gestión de Cambio.	Manual – Preventivo.

3. Proceso para Revisar Solicitudes de Control de Cambio

3.1. Objetivo, Alcance y Frecuencia del Proceso.

Objetivo: Velar porque las Solicitudes de Cambio IT o RFC estén debidamente llenados y con todos los anexos correspondientes.

Alcance: Recepción de las Solicitudes de Cambio IT o RFC, desde la gerencia solicitante hasta la aplicación del cambio en las fechas planificadas.

Frecuencia: Cada vez que las unidades solicitantes generen y envíen una Solicitud de Cambio o RFC al Asesor de Gestión de Cambio.

3.2. Normas Específicas.

3.2.1. Del Asesor de Gestión de Cambio.

a. Velar porque cada RFC cumpla con los requisitos o exigencias mínimas para la aplicación del cambio.

3.3. Entradas y Salidas del Proceso.

Entradas: Revisar la completitud del RFC indicando las instrucciones a realizar.

Salidas: La aprobación de la solicitud.

3.4 Descripción del Proceso.

Proceso Para Revisar Solicitudes

Asesor de Gestión de Cambio

1. Revisa la solicitud y verifica que posea sus respectivos soportes, y que toda la información requerida en el formato se encuentre detallada y completa en todos sus campos. Si la revisión es aprobada y los soportes son los correctos, continúa con el paso 2, en caso contario continúa con paso 3 de este procedimiento.

2. Verifica tipo de Cambio a fin de conocer si se trata de un Cambio tipo estándar, emergencia o planificado. Se activa el proceso para “Implantar Control de Cambio”; dependiendo del tipo de: En caso de ser un Cambio Estándar se activa el proceso para “Realizar Cambios Estándar”; si se trata de una Cambio de Emergencia se activa el proceso para “Realizar Cambios de Emergencia” y en caso de ser una Cambio Planificado se activa el proceso para “Realizar Cambios Planificados”. Una vez efectuado el cambio, se activa el “Proceso de para Evaluar y Cerrar Control de Cambio”. Fin del Proceso.
3. Actualiza información en el RFC sobre los detalles del rechazo en la fase de revisión, indica las observaciones relacionadas con los ajustes y demás detalles a corregir.
4. Devuelve el RFC al Iniciador del Cambio vía correo electrónico con copia a la áreas involucradas indicando las causas del rechazo de la revisión del RFC.

Área Solicitante / Iniciador de Cambio

5. Recibe correo electrónico indicando las causas del rechazo de la revisión del RFC.

6. Corrige el RFC, según las indicaciones del Asesor de Gestión de Cambios.

7. Reenvía el RFC al Asesor de Gestión de Cambios; al retornar el RFC al Asesor de Gestión de Cambios. Se activa el proceso “Para Registrar Solicitudes de Control de Cambio”.

3.5. Actividades de Control.

Actividad	Frecuencia	Responsable	Tipo de Control
Actividad Nº 1 Revisa Solicitud, verifica que posea sus respectivos soportes y que toda la información requerida en el formato, esté detallada y completo.	Cada vez que recibe el RFC.	Gestión de Cambios.	Manual – Preventivo.
Actividad Nº 2 Verifica tipo de Cambio.	Se realiza la actividad con cada Uno de los RFC que reciba y conocer tipo de cambio.	Gestión de Cambios.	Manual – Preventivo.
Actividad Nº 6 Corrige el RFC.	Sólo en los momentos en que Le sea devuelto por el Asesor de Gestión de Cambios.	Área Solicitante / Iniciador del Cambio.	Manual – Preventivo.

4. Proceso para Evaluar y Planificar Control de Cambio

4.1 Objetivo, Alcance y Frecuencia del Proceso.

Objetivo: Coordinar en función a lo evaluado la planificación para la ejecución del control de cambio.

Alcance: Simplificación de los RFC para los controles de cambio.

Frecuencia: Cada vez que las unidades solicitantes generen y envíen un control de cambio o RFC al Asesor de Gestión de Cambio.

4.2 Normas Específicas.

4.2.1. Del Asesor de Gestión de Cambio.

a. Registrar las incidencias como tipo de Cambio de Emergencia.
b. Evaluar todos los cambios de emergencia de alto impacto, a través del Comité de Cambios de Emergencia (CCE).
c. Revisar todo cambio que pueda afectar los distintos cierres (Mensual / Anual), en fechas críticas.
d. Manejar a través de una solicitud en el SIU, todos los cambios de INTRANET los cuales no tengan afectación en el código, agregando las Órdenes de Trabajo que correspondan, a cada una de las unidades implantadoras.

4.3 Entradas y Salidas del Proceso

Entradas: Evaluación del Impacto del Control de Cambio.

Salidas: La planificación de la implantación

4.4 Descripción del Proceso.

Proceso Para Evaluar y Planificar

Asesor de Gestión de Cambios

1. Evalúa el Impacto del cambio para analizar la afectación del mismo en la operatividad del aplicativo. Si el cambio es de alto impacto, continúa con el paso siguiente, en caso contrario continúa con el paso 6 de este procedimiento.
2. Convoca a una reunión del Comité Ejecutivo de Cambio (CEC).
3. Revisan la Solicitud de Cambio IT (RFC) para acordar la fecha y hora para efectuar el pase a producción, así como el plan de contingencia en caso de afectación de la operatividad.
4. Revisan las instrucciones para el Roll Back, validan factibilidad del cambio. Si el cambio es factible continúa con el paso 5, en caso contrario continúa con el paso 7 de este procedimiento.

5. Convoca al Comité Ejecutivo de Cambios (CEC) con todas las áreas involucradas en el proceso una vez que se cuente con la información definitiva del cambio. Se activa el “Proceso para Implantar Control de Cambio” (CEC). Fin del proceso.
6. Asiste a la Reunión Ordinaria Semanal del Comité de Cambios (CC) convocada siempre y cuando existan solicitudes. Se activa el “Proceso para Implantar Control de Cambio” (CC). Fin del proceso.
7. Registra el rechazo en el RFC en el aplicativo, indicando el motivo de rechazo.
8. Devuelve el RFC vía correo electrónico al Iniciador del Cambio y anexa indicaciones para su ajuste. Se activa el “Proceso para Evaluar y cerrar Control de Cambio”. Fin del proceso.

4.5 Actividades de Control.

Actividad	Frecuencia	Responsable	Tipo de Control
Actividad Nº 3 Revisa Presentación del cambio con Línea de Tiempo y Plan de Actividades, ésta revisión debe realizarse con los integrantes de la reunión, la línea de tiempo y el plan de actividades a ser efectuado al momento de aplicar el cambio.	Cada vez que recibe el RFC.	Gestión de Cambios.	Manual – Preventivo.

5. Proceso para Implantar Control de Cambio

5.1 Objetivo, Alcance y Frecuencia del Proceso.

Objetivo: Aplicar los procedimientos para la implantación de los cambios, solicitados por la unidad solicitante.

Alcance: Cambios aplicados en el ambiente de producción.

Frecuencia: Cada vez que las unidades solicitantes generen y envíen un control de cambio o RFC a Gestión de Cambio.

5.2 Normas Específicas.

5.2.1. Del Asesor de Gestión de Cambio.

a. Establecer que los cambios según su origen, sean certificados por los equipos que correspondan, de la Gerencia de Seguridad de la Información, la Gerencia Tecnología, la Gerencia de Sistemas y el Asesor de Gestión de la Demanda.
b. Realizar las pruebas en Ambiente de Desarrollo y una vez certificadas en QA, ejecutar el Cambio en Ambiente de Producción, Para los casos de sistemas enlazados con Entes Externos, los cuales no adopten el esquema de tres (3) ambientes Desarrollo, Calidad y Producción . Se velara por las instrucciones de mitigación de riesgos. En caso de que esto se refiera a soluciones de consultores externos (tipo Bleico) en la empresa lo ha venido ejecutando el área de Requerimientos, pero ninguno de nosotros “ejecuta el Cambio en Ambiente de Producción” eso solo lo hace DBA u otra área de tecnología y gestión de cambios lo procesa como un cambio más, solo que el Solicitante IT es externo y se lleva un control de los controles de cambios que involucren este tipo de solicitante. En el caso sea un aplicativo tipo SAINT eso para por un control de cambio que se atribuye al área de tecnología ya sea soporte desk u otra según lo señale el correo que se reciba.

5.3 Entradas y Salidas del Proceso.

Entradas: Certificación de las instrucciones para la ejecución del Roll Back.

Salidas: Envío de RFC al grupo de implantación.

5.4 Descripción del Proceso.

Proceso Para Implantar Control de Cambio

Asesor de Gestión de Cambio / Comité de Cambios (CC)

1. Consulta al solicitante y al implantador el momento sugerido para la ejecución del cambio.
2. Valida las instrucciones para el Roll Back en el RFC.
3. Verifica si el cambio a implanta es de alto impacto. Si es de alto impacto continúa con el paso 6, en caso contrario continúa con el paso siguiente de este procedimiento.
4. Planifica la fecha de implantación, verificando los posibles riesgos, consulta al Comité de Cambios (CC) la fecha de implantación.
5. Registra en el RFC la fecha y hora del pase a producción. Continúa con el paso 9 de este procedimiento.
6. Revisa la estrategia, fecha y hora planificada para hacer el pase a producción, en presencia del CEC notifica la estrategia, fecha y hora propuesta para aplicar el cambio.
7. Notifica los acuerdos establecidos en el comité a todas las áreas involucradas de los puntos acordados para llevar a cabo dicho cambio.
8. Discuten los comunicados a enviar antes de efectuar el cambio.

Asesor de Gestión de Cambios

9. Redacta en minuta los acuerdos del comité, con la fecha y hora asignada al cambio, el número de RFC, la descripción, y el nombre del Iniciador del Cambio (IC), escribe en la minuta la autorización y demás detalles a ser considerados, para aplicar dicho cambio.
10. Envía la minuta a los asistentes de la reunión y copia a todas las áreas involucradas en el proceso.
11. Envía el RFC al área Implantadora para que sea efectuado el pase a producción. Se activa el “Proceso para Evaluar y Cerrar Control de Cambio”. Fin del Proceso.

Gerencia de Tecnología (Implantadores)

12. Recibe correo electrónico de autorización para efectuar el cambio.
13. Ejecuta el cambio en presencia del Iniciador y siguiendo las instrucciones indicadas en el RFC.
14. Revisa la puesta en Producción del cambio efectuado.
15. Verifica la continuidad operativa, para certificar el correcto funcionamiento de los procesos relacionados.
16. Responde vía correo electrónico a Seguridad de la Información con copia al Asesor de Gestión de Cambio y a las todas las áreas involucradas que fue efectuado el cambio solicitado indicando fecha y hora de implantación.

Asesor de Gestión de Cambios

17. Recibe Respuesta del pase efectuado. Se activa el “Proceso para evaluar y Cerrar.

5.5 Actividades de Control.

Actividad	Frecuencia	Responsable	Tipo de Control
Actividad Nº 4. Planifica la fecha de implantación, verificando los posibles riesgos, evalúa si existe algún tipo de riesgo, efectúa el cambio en fecha y hora previamente establecida	Cada vez que recibe el RFC.	Gestión de Cambios.	Manual – Preventivo.

6. Proceso para Realizar Cambios de Tipo Estándar

6.1. Objetivo, Alcance y Frecuencia del Proceso.

Objetivo: Revisar e implantar cambios estándar.

Alcance: Recepción de estas solicitudes o RFC desde la Gerencia solicitante, hasta la aplicación del cambio de tipo estándar en las fechas planificadas.

Frecuencia: Cada vez que las unidades solicitantes generen y envíen un control de cambio o RFC a Gestión de Cambios.

6.2. Normas Específicas.

6.2.1. Del Asesor de Gestión de Cambio.

a. Documentar y Pre-aprobar, los procedimientos para los cambios de tipo estándar, que tendrán su origen en la Gerencia de Sistemas o cualquier otra área solicitante, a fin de agilizar su gestión y mejorar los tiempos de respuesta.

b. A través de un RFC de tipo Estándar con origen Gerencia de Sistemas o cualquier otra área solicitante, todas las Restauraciones de Producción a Desarrollo, debe tener adjunta la autorización del Gerente del Iniciador del Cambio y Seguridad de la Información, así como el documento con la información solicitada con Seguridad de la Información.

6.3. Entradas y Salidas del Proceso.

Entradas: Revisar la completitud del RFC o Solicitud de Control de Cambio, indicando las instrucciones a realizar.

Salidas: La aprobación de la solicitud.

6.4. Descripción del Proceso.

Proceso Para Realizar Cambios de Tipo Estándar

Gerente Seguridad de la Información / Asesor de Gestión de Cambio

1. Evalúa la Solicitud de Cambio recibida a fin de verificar que el mismo pueda ejecutarse satisfactoriamente. Si el cambio es aprobado continúa con el paso siguiente, en caso contrario continúa con el paso 4 de este procedimiento.
2. Aprueba el cambio en consenso con el Asesor de Gestión de Cambios, una vez evaluada la factibilidad.
3. Envía autorización del cambio al grupo responsable de la actividad (Gerencia de Tecnología) vía correo electrónico, a fin de que se efectúe el cambio.

Gerencia de Tecnología (Implantadores)

4. Recibe correo electrónico de autorización para efectuar el cambio.
5. Ejecuta el cambio en presencia del Iniciador y siguiendo las instrucciones indicadas en el RFC.
6. Revisa la puesta en Producción del cambio efectuado.

7. Verifica la continuidad operativa, para certificar el correcto funcionamiento de los procesos relacionados.
8. Responde vía correo electrónico a Seguridad de la Información con copia al Asesor de Gestión de Cambio y a las todas las áreas involucradas que fue efectuado el cambio solicitado indicando fecha y hora de implantación.

Asesor de Gestión de Cambio

9. Recibe correo electrónico con respuesta del cambio efectuado.
10. Cierra el RFC con el resultado correspondiente.
11. Elabora expediente digital con toda la información relacionada con el pase a producción efectuado y lo almacena en la carpeta compartida de la Gerencia de Gestión de la Demanda.

12. Envía correo electrónico a todas las áreas involucradas indicando la ruta y el nombre del expediente digital creado. Se activa el proceso de “Evaluar y Cerrar Control de Cambio”. Fin del proceso.

6.5. Actividades de Control.

Actividad	Frecuencia	Responsable	Tipo de Control
Actividad Nº 1 Evalúa el cambio, entre Gestión de Cambios y Seguridad de la Información, que el cambio pueda llevarse a cabo	Cada vez que recibe el RFC.	Gestión de Cambios.	Manual – Preventivo.
Actividad Nº 7 Verifica la continuidad operativa, para certificar los procesos relacionados	Se realiza la actividad con cada uno de los RFC que reciba.	Implantadores.	Manual – Preventivo.

7. Proceso para Realizar Cambios de Tipo Emergencia

7.1. Objetivo, Alcance y Frecuencia del Proceso.

Objetivo: Revisar los controles de cambio de tipo emergencia, para que sean implantados con la prioridad que amerite y bajo los procedimientos establecidos. **Alcance:** Recepción de estas solicitudes o RFC desde las Gerencias solicitantes, hasta la aplicación de cambios de tipo emergencia en las fechas acordadas.

Frecuencia: Cada vez que las unidades solicitantes generen y envíen una Solicitud de Cambio IT o RFC, al Asesor de Gestión de Cambio.

7.2. Normas Específicas.

7.2.1. Del Comité de Cambio de Emergencia / Integrantes del Comité.

a. Evaluar todos los cambios de emergencia de alto impacto, por el Comité de Emergencia (CCE).

7.3. Entradas y Salidas del Proceso.

Entradas: Revisar el RFC o Solicitud de Control de Cambio, a fin de determinar la emergencia, el impacto y la factibilidad.

Salidas: La aprobación de la solicitud.

7.4. Descripción del Proceso.

Proceso Para Realizar Cambio de Tipo Emergencia

Asesor de Gestión de Cambio

1. Verifica el tipo de emergencia, si la Emergencia reportada es de Alto Impacto, continúa con el paso siguiente, en caso contrario continúa con el paso 11 de este procedimiento.
2. Analiza todos los detalles que avalen el cambio de Emergencia de Alto Impacto y el posible riesgo del cambio en la implantación, a fin de tomar las previsiones del caso.
3. Verifica si la convocatoria de Control de Cambio es en horario laboral, si es en horario laboral continúa con el paso siguiente, en caso contrario continúa con el paso 5 de este procedimiento.
4. Convoca a los integrantes del Comité de Emergencia (CCE), según lo establece la Estructura (Ver numeral 3 de la Conceptualización y Bases Teóricas de este documento). Continúa con el paso 6 de este procedimiento.
5. Convoca vía telefónica a los integrantes del Comité de Emergencia (CCE), se efectúa el comité en conferencia telefónica.
6. Comunica al CCE, el cambio, los posibles riesgos y Roll Back de la implantación del cambio.

Comité de Cambios de Emergencia (CCE)

7. El Comité de Cambios de Emergencia acuerda en forma conjunta la autorización o no del cambio. Si el cambio es autorizado continúa con el paso siguiente, en caso contrario continúa con el paso 13 de este procedimiento.

NOTA: Cabe destacar, que si el CCE es convocado vía telefónica, la autorización debe venir vía correo desde el buzón de Gestión de Cambios, del buzón de Seguridad de la Información. En caso de no poder establecer contactos con todos los integrantes del comité, se procesaran las solicitudes con la aprobación del 75% de los integrantes del CCE.

Asesor de Gestión de Cambio

8. Elabora la minuta del comité efectuado y los acuerdos establecidos en el mismo, indicando la autorización del CCE a todas las áreas involucradas, para la ejecución del cambio analizado.

9. Envía solicitud de efectuar el cambio vía correo electrónico anexando el digital de la minuta notificando a todas las áreas involucradas, incluyendo al iniciador de cambio.

10. Solicita al Iniciador del Cambio vía correo electrónico que proceda a realizar el RFC Post–Mortem (Solicitud de Cambio IT), además de indicar que debe anexar el digital de toda la documentación correspondiente al cambio de emergencia, incluyendo la minuta de autorización. Continúa con el paso 15 de este procedimiento.

NOTA: Los pasos 9 y 10 se efectúan en simultáneo.

11. Evalúa la factibilidad del cambio (Incidencia/Requerimiento) Junto al gerente de Seguridad de la Información en cuanto el cambio pueda llevarse a cabo. Si

aprueba la ejecución del cambio evaluado continúa con el paso siguiente, en caso contrario continúa con el paso 14 de este procedimiento.

12. Solicita efectuar el cambio autorizado por el Asesor de Gestión de Cambios y el Gerente de Seguridad de la Información vía correo electrónico por parte de Seguridad de la Información, a fin de que se efectúe el cambio. Continúa con el paso 15 de este procedimiento.
13. Elabora la minuta del comité efectuado y los acuerdos establecidos en el mismo, indicando el rechazo del CCE a todas las áreas involucradas, para la ejecución del cambio analizado.
14. Notifica el rechazo del pase a Producción, informando en conjunto al CCE y a todas las áreas involucradas para su ajuste. Se activa el proceso de “Revisar Solicitudes de Control de Cambio”. Fin del proceso.

Gerencia de Tecnología (Implantadores)

15. Recibe correo electrónico de autorización para efectuar el cambio.
16. Ejecuta el cambio en presencia del Iniciador y siguiendo las instrucciones indicadas en el RFC.
17. Revisa la puesta en Producción del cambio efectuado.
18. Verifica la continuidad operativa, para certificar el correcto funcionamiento de los procesos relacionados.
19. Responde vía correo electrónico a Seguridad de la Información con copia al Asesor de Gestión de Cambio y a las todas las áreas involucradas que fue efectuado el cambio solicitado indicando fecha y hora de implantación.
20. Recibe correo electrónico con respuesta del cambio efectuado.
21. Cierra el RFC con el resultado correspondiente.

22. Elabora expediente digital con toda la información relacionada con el pase a producción efectuado y lo almacena en la carpeta compartida de la Gerencia de Gestión de la Demanda.

7.5 Actividades de Control.

Actividad	Frecuencia	Responsable	Tipo de Control
Actividad Nº 1. Verifica el tipo de emergencia, si la Emergencia reportada, es de Alto Impacto, efectuar el Procedimiento 2, de lo contrario realizar el procedimiento 18	Cada vez que recibe el RFC.	Gestión de Cambios.	Manual – Preventivo.
Actividad Nº 2 Evalúa y determina el riesgo del cambio, evaluando el posible riesgo en la implantación del cambio, a fin de tomar las previsiones del caso.	Cada vez que recibe el RFC.	Gestión de Cambios.	Manual – Preventivo.
Actividad N° 4 Convoca reunión con el Comité de Emergencia (CCE), debe ser presencial, a los integrantes del CCE y los implantadores involucrados	Cada vez que recibe el RFC.	Gestión de Cambios.	Manual – Preventivo.

Actividad N°5 Comunica al CCE, el cambio, sus posibles riesgos y roll back, explica todos los detalles relacionados con el cambio a ser implantado, incluyendo riesgos y roll back.	Cada vez que recibe el RFC.	Gestión de Cambios.	Manual – Preventivo.
Actividad N°9 Envía minuta Notificando a todos los involucrados, la minuta debe ser enviada a todos los integrantes del CCE, al iniciador de cambio y sus gerentes, así como a las gerencias implantadoras, que efectuarán dicho cambio.	Cada vez que recibe el RFC.	Gestión de Cambios.	Manual – Preventivo.
Actividad N°17 Revisa la puesta en producción, con el resultado de la misma.	Cada vez que recibe el RFC.	Implantadores.	Manual – Preventivo.

8. Proceso para Realizar Cambios de Tipo Planificado

8.1 Objetivo, Alcance y Frecuencia del Proceso

Objetivo: Coordinar los controles de cambio de tipo Planificado para que sean implantados.

Alcance: Recepción de estas solicitudes o RFC desde las Gerencias solicitantes, hasta la aplicación del control de cambio en las fechas planificadas a los cambios de tipo Planificado.

Frecuencia: Cada vez que las unidades solicitantes generen y envíen un control de cambio o RFC al Asesor de Gestión de Cambio.

8.2 Normas Específicas.

8.2.1. Del Asesor de Gestión de Cambio.

a. Evaluar los cambios para que sean discutidos ante el Comité de Cambios (CC), el cual se convoca siempre y cuando existan solicitudes.

8.3 Entradas y Salidas del Proceso.

Entradas: Revisar la completitud del RFC o Solicitud de Control de Cambio indicando las instrucciones a realizar.

Salidas: La aprobación de la solicitud.

8.4 Descripción del Proceso.

Proceso Para Realizar Cambio de Tipo Planificado

Gerente de Seguridad de la Información

1. Evalúa la factibilidad e impacto de la solicitud de cambio para la aprobación o rechazo del mismo. Si el cambio es factible continúa con el paso siguiente, en caso contrario continúa con el paso 3 de este procedimiento.
2. Envía autorización del cambio al grupo responsable de la actividad (área implantadora) vía correo electrónico, a fin de que se efectúe el cambio. Continúa con el paso 4 de este procedimiento.
3. Devuelve el RFC al Iniciador del Cambio vía correo electrónico indicando las causas. Se activa el “Proceso para Evaluar y Cerrar Control de Cambio”. Fin del Proceso.

Gerencia de Tecnología (Implantadores)

4. Recibe correo electrónico de autorización para efectuar el cambio.
5. Ejecuta el cambio en presencia del Iniciador y siguiendo las instrucciones indicadas en el RFC.
6. Revisa la puesta en Producción del cambio efectuado.
7. Verifica la continuidad operativa, para certificar el correcto funcionamiento de los procesos relacionados.
8. Responde vía correo electrónico a Seguridad de la Información con copia al Asesor de Gestión de Cambio y a las todas las áreas involucradas que fue efectuado el cambio solicitado indicando fecha y hora de implantación.

Asesor de Gestión de Cambios

9. Recibe correo electrónico con respuesta del cambio efectuado.
10. Cierra el RFC con el resultado correspondiente.
11. Elabora expediente digital con toda la información relacionada con el pase a producción efectuado y lo almacena en la carpeta compartida de la Gerencia de Gestión de la Demanda. Se activa el “Proceso para Evaluar y Cerrar de Control de Cambio”. Fin del proceso.

8.5 Actividades de Control.

Actividad	Frecuencia	Responsable	Tipo de Control
Actividad Nº 1 Verifica la factibilidad y el impacto del RFC. La unidad de control, debe validar la factibilidad y evaluar el impacto del cambio.	Cada vez que recibe el RFC con ésta condición.	Representantes de las diferentes unidades de control.	Manual – Preventivo.

9. Proceso para Evaluar y Cerrar Control de Cambio

9.1. Objetivo, Alcance y Frecuencia del Proceso

Objetivo: Evaluar los resultados de la aplicación del control de cambio.

Alcance: Evaluación de los resultados obtenidos, sean satisfactorios en el ambiente de producción.

Frecuencia: Se aplica cada vez que se ejecute el control de cambio.

9.2. Normas Específicas.

9.2.1. Del Asesor de Gestión de Cambio.

a. Evaluar todos aquellos cambios aplicados que afecte un servicio o componente de la Infraestructura Tecnológica, se tendrá la autoridad de detener la ejecución de un cambio o aplicar reverso del mismo, siempre y

cuando dicha decisión sea previamente tomada en consenso con los Gerentes involucrados y/o afectados.

b. Crear en la carpeta compartida de la Gerencia de Gestión de la Demanda un expediente en digital con toda la información relacionada con el pase a producción efectuado.
c. Informar a la Gerencia de Gestión de la Demanda, a la Jefatura de Gestión de Requerimientos, a la Jefatura de Soporte Integral al Usuario y a todas las áreas involucradas sobre el pase a producción de los requerimientos e incidencias que sean procesados, así como indicar el nombre y ruta de la carpeta compartida donde se almacena en digital toda la información relacionada con el pase a producción efectuado.
d. Elaborar Informes Estadísticos periódicos, que permitan evaluar el rendimiento de la Gestión de Cambios (Ver Anexo 13 de este documento).

9.3. Entradas y Salidas del Proceso

Entradas: Recibe los resultados del RFC ejecutado.

Salidas: Cierre del RFC con los resultados exitosos.

9.4. Descripción del Proceso.

Proceso Para Evaluar y Cerrar el RFC

Asesor de Gestión de Cambio

1. Verifica el resultado de la ejecución del cambio, a fin de corroborar si fue fallido o exitoso. Si el cambio fue exitoso continúa con el paso siguiente, en caso contrario continúa con el paso 4 de este procedimiento.

2. Cierra el RFC indicando resultado exitoso, con la fecha y hora de implantación y documentando que el resultado fue exitoso en al aplicativo correspondiente, asimismo, indica si los documentos anexados están completos.
3. Elabora expediente digital con toda la información relacionada con el pase a producción efectuado y lo almacena en la carpeta compartida de la Gerencia de Gestión de la Demanda. Fin del proceso.
4. Cancela el RFC.
5. Envía el proceso Roll Back a la Gerencia de Tecnología (Implantadores).

Gerencia de Tecnología (Implantadores)


6. Recibe correo electrónico de solicitud para efectuar el Roll Back.
7. Ejecuta el Roll Back del RFC.
8. Verifica la continuidad operativa y correcto funcionamiento de los procesos.
9. Responde con copia a todas las áreas involucradas que fue efectuado el cambio.

Asesor de Gestión de Cambio


10. Recibe respuesta del Roll Back efectuado.
11. Documenta el resultado del RFC en el aplicativo indicando el motivo de la falla
12. Cierra el RFC indicando resultado fallido, con la fecha y hora de implantación y documentando que el resultado no fue exitoso. Se activa el “Proceso para Registrar Solicitudes de Control de Cambio”. Fin del Proceso.

Anexos


1. Flujograma Macro Proceso para Gestionar Control de Cambio

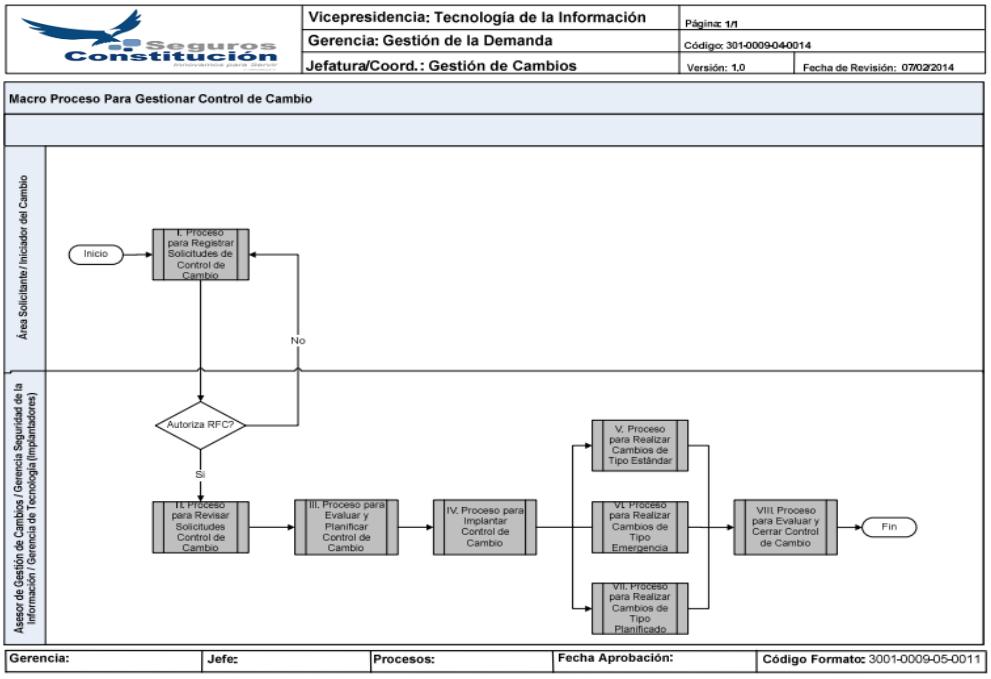


2. Flujograma Proceso para Registrar Solicitudes de Control de Cambio

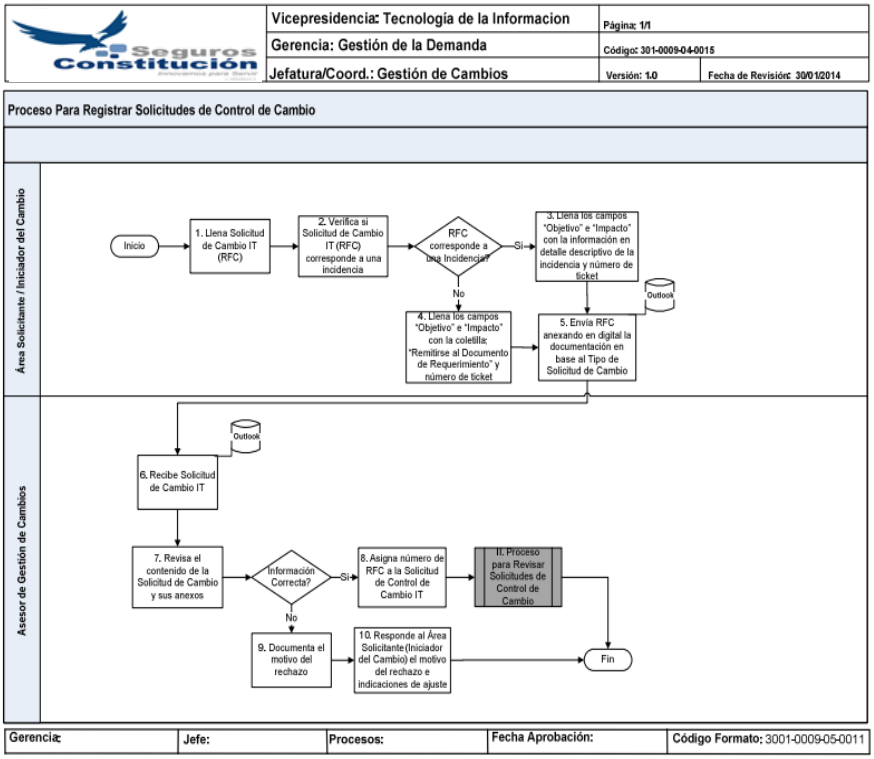


3. Flujograma Proceso para Revisar Solicitudes de Control de Cambio

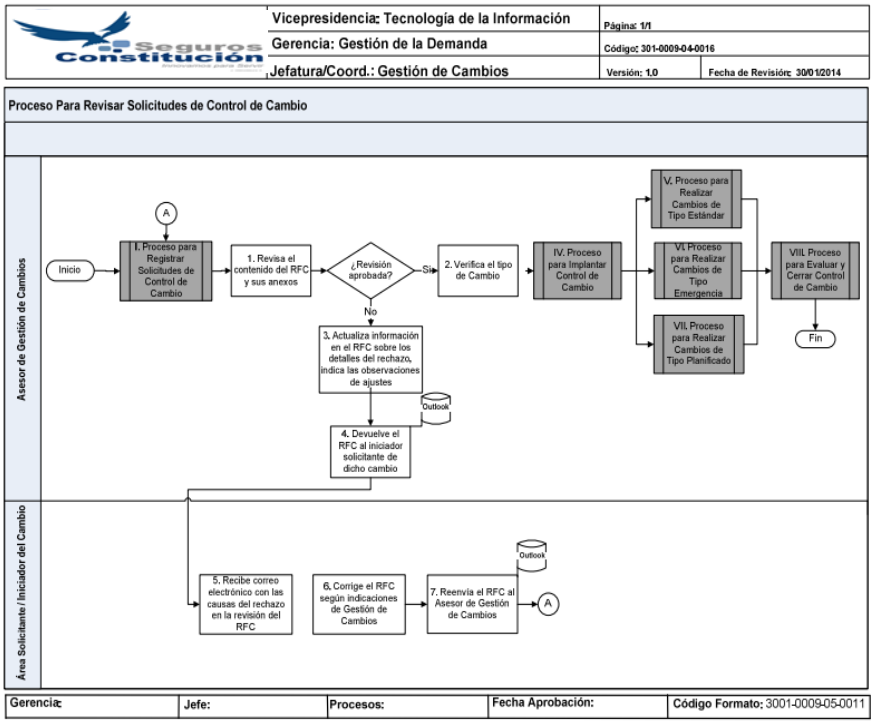


4. Flujograma Proceso para Evaluar y Planificar Control de Cambio

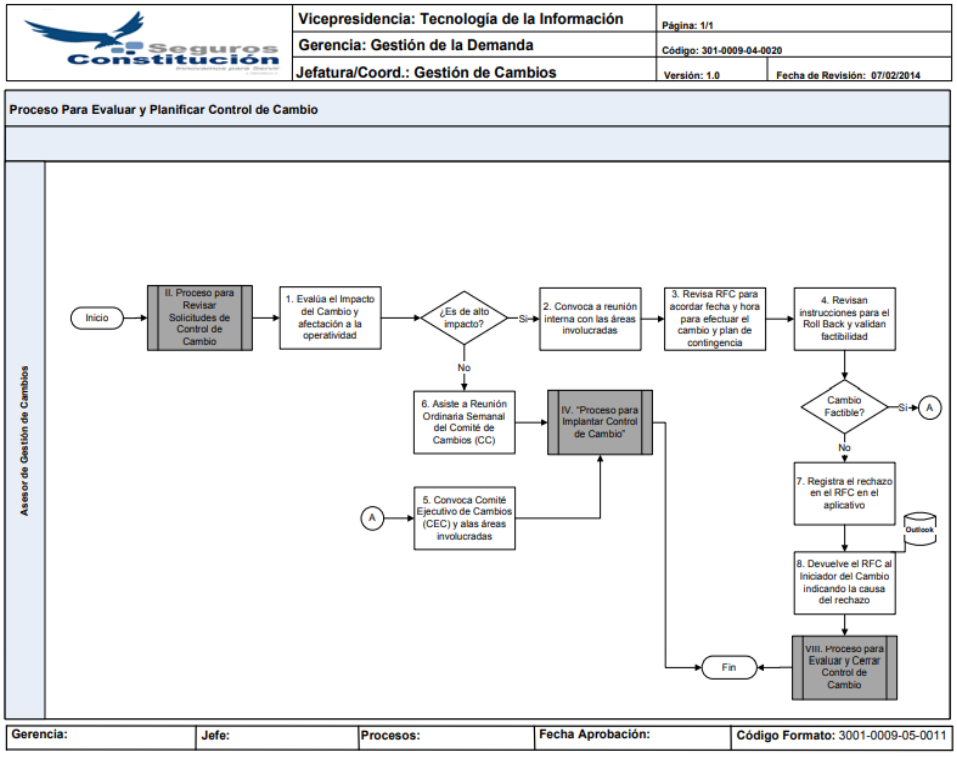


5. Flujograma Proceso para Implantar Control de Cambio

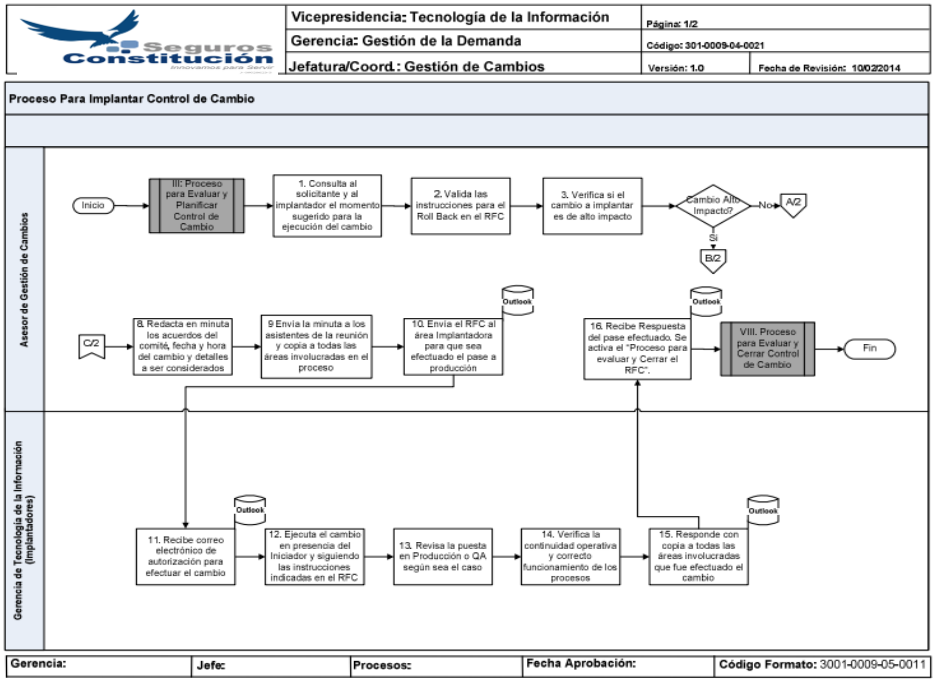


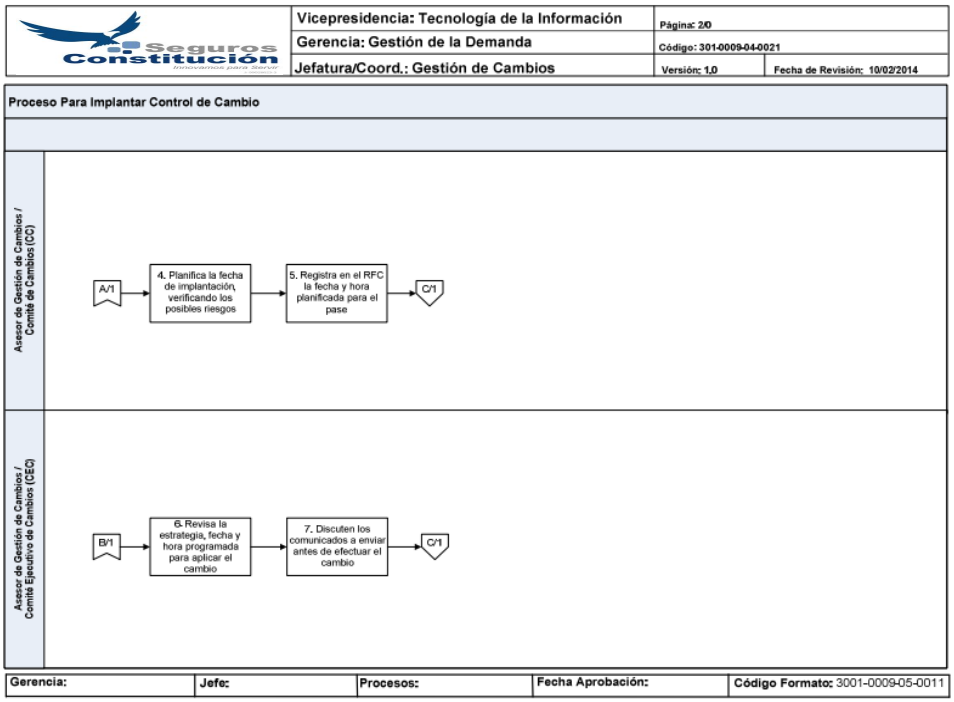

Seguros Constitución
Innovamos para Servir
Vicepresidencia: Tecnología de la Información
Página: 2/0
Gerencia: Gestión de la Demanda
Código: 301-0009-04-0021
Jefatura/Coord.: Gestión de Cambios
Versión: 1.0
Fecha de Revisión: 10/02/2014
Proceso Para Implantar Control de Cambio
Asesor de Gestión de Cambios / Comité de Cambios (CC)
A/1
4. Planifica la fecha de implantación, verificando los posibles riesgos
5. Registra en el RFC la fecha y hora planificada para el pase
C/1
Asesor de Gestión de Cambios / Comité Ejecutivo de Cambios (CEC)
B/1
6. Revisa la estrategia, fecha y hora programada para aplicar el cambio
7. Discuten los comunicados a enviar antes de efectuar el cambio
C/1
Gerencia:
Jefe:
Procesos:
Fecha Aprobación:
Código Formato: 3001-0009-05-0011

6. Flujograma Proceso para Realizar Cambios Tipo Emergencia

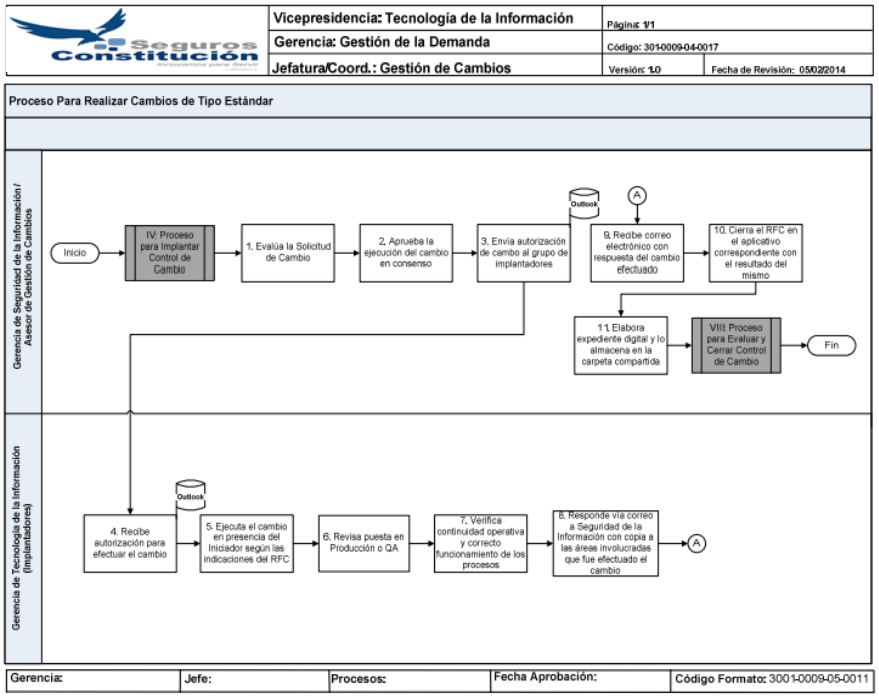


7. Flujograma Proceso para Realizar Cambios Tipo Emergencia

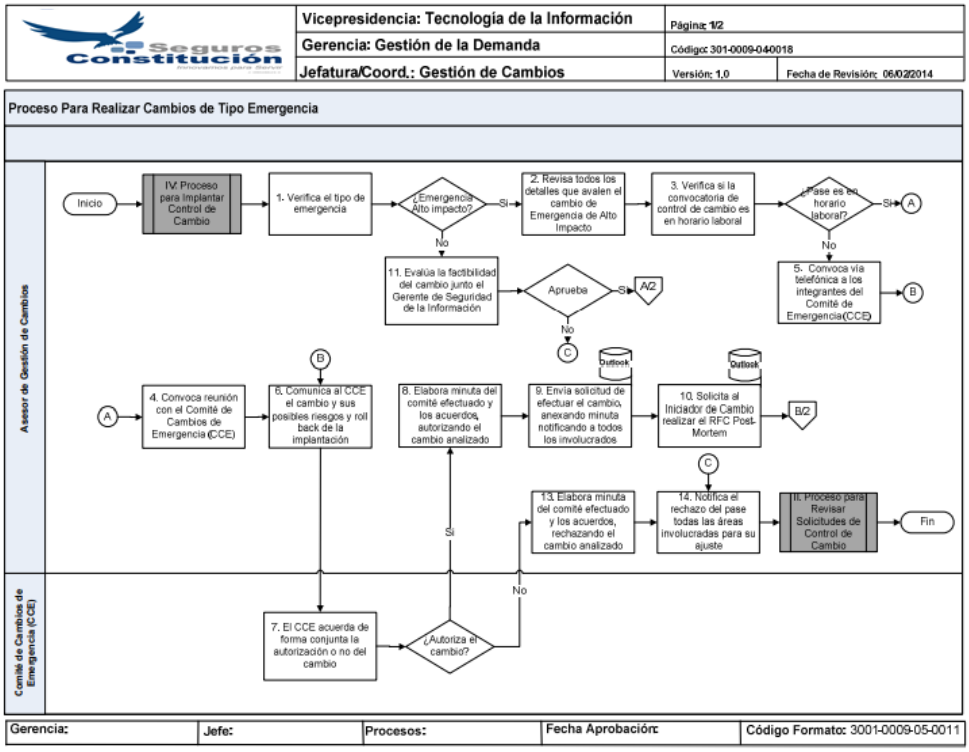


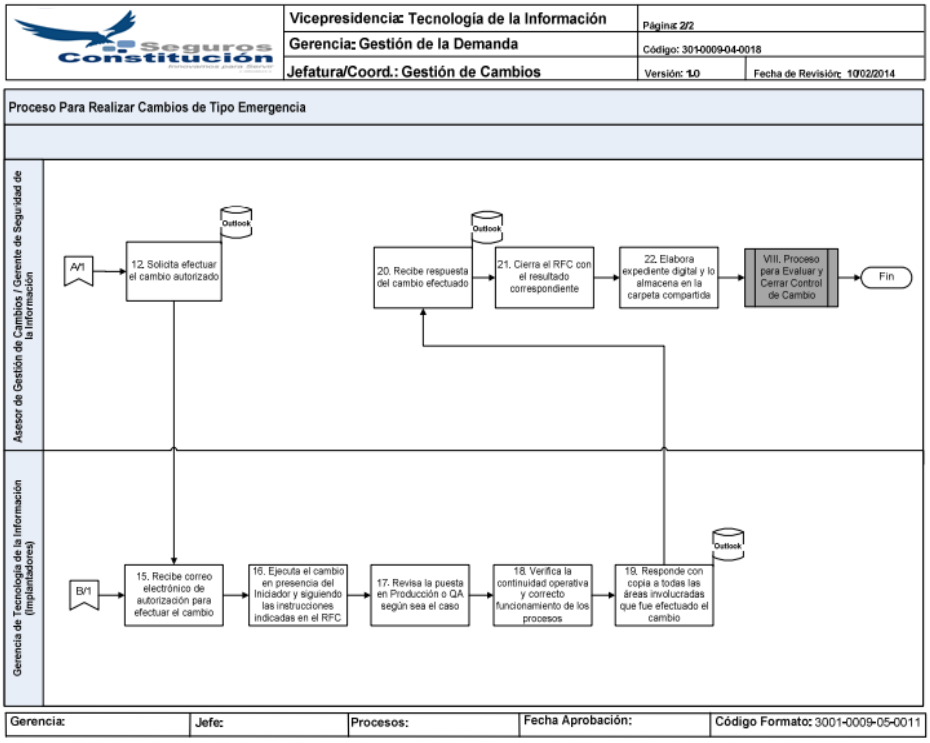
Seguros Constitución
Vicepresidencia: Tecnología de la Información
Página: 2/2
Gerencia: Gestión de la Demanda
Código: 301-0009-04-0018
Jefatura/Coord.: Gestión de Cambios
Versión: 1.0
Fecha de Revisión: 10/02/2014
Proceso Para Realizar Cambios de Tipo Emergencia
Asesor de Gestión de Cambios / Gerente de Seguridad de la Información
Gerencia de Tecnología de la Información (Implantadores)
A/1
12. Solicita efectuar el cambio autorizado
Outlook
20. Recibe respuesta del cambio efectuado
21. Cierra el RFC con el resultado correspondiente
22. Elabora expediente digital y lo almacena en la carpeta compartida
VIII. Proceso para Evaluar y Cerrar Control de Cambio
Fin
B/1
15. Recibe correo electrónico de autorización para efectuar el cambio
16. Ejecuta el cambio en presencia del Iniciador y siguiendo las instrucciones indicadas en el RFC
17. Revisa la puesta en Producción o QA según sea el caso
18. Verifica la continuidad operativa y correcto funcionamiento de los procesos
19. Responde con copia a todas las áreas involucradas que fue efectuado el cambio
Gerencia:
Jefe:
Procesos:
Fecha Aprobación:
Código Formato: 3001-0009-05-0011

8. Flujograma Proceso para Realizar Cambios Tipo Planificado

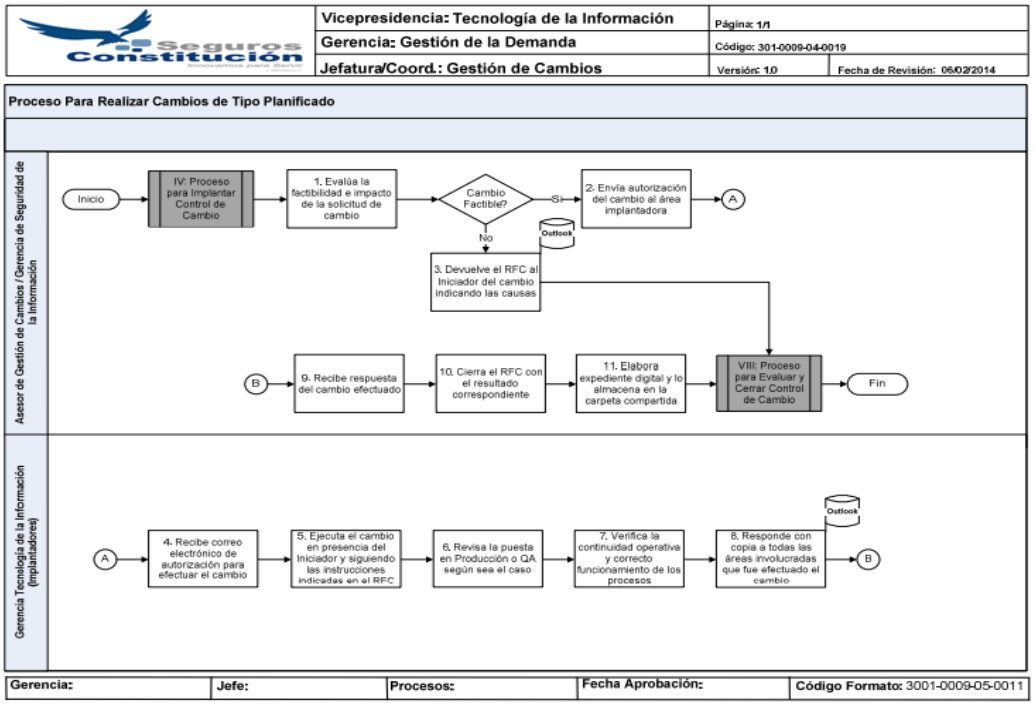

9. Flujograma Proceso para Evaluar y Cerrar Control de Cambio

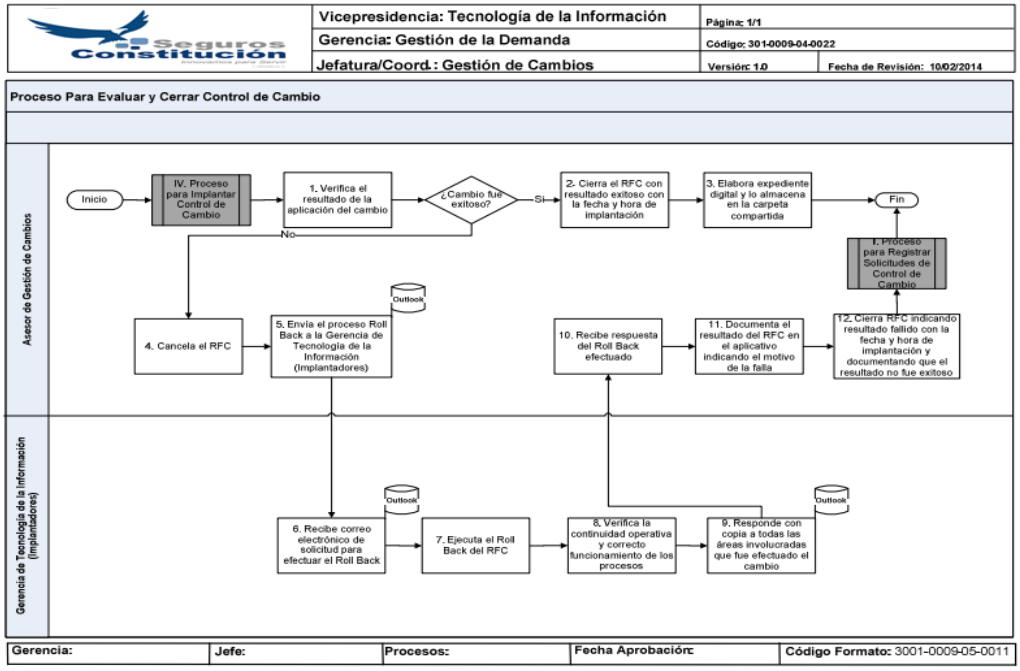

10. Reglas de Negocio

Origen del Cambio	Tipo de Cambio	Válido
Incidente	Estándar	NO
Incidente	Planificado	NO
Incidente	Emergencia	SI
Requerimiento	Estándar	NO
Requerimiento	Planificado	SI
Requerimiento	Emergencia	SI
Proyecto	Estándar	NO
Proyecto	Planificado	SI
Proyecto	Emergencia	NO

11. Criterios de Clasificación

A continuación, se detallan los criterios a utilizar para definir el tipo de cambio, la urgencia, el impacto, la prioridad y el tipo de origen de una solicitud de cambio.

TIPO DE CAMBIO

- **Emergencia:** Se consideran Cambios de Emergencia, cuando un servicio se encuentra fuertemente afectado, degradado o detenido. Cabe destacar, que entre ellas se encuentran las afectaciones a servicios de misión crítica o core, que impactan a gran cantidad de usuarios, y las cuales son detectadas y corregidas de forma inmediata. Así mismo, son consideradas de Emergencia, las que reparan un error o falla en un "Elemento de Configuración" y requieren ser revisados, aprobados y probados tan rápido como sea posible. Por tal motivo, todas las "Incidencias", deben ser tratadas como "Emergencia". Es importante dejar asentado, que las "Emergencias de Bajo Impacto" y "Medio Impacto", no necesitan de la activación de un Comité de Cambios de Emergencia.
- **Estándar:** Son aquellas solicitudes de cambio estandarizadas y previamente documentadas y pre-aprobadas, cuyo procedimiento es iterativo, de bajo impacto y riesgo, así como de fácil implementación. Por tal motivo, no requieren ser presentados en el Comité de Cambios (sin embargo se reserva la intención de presentación a discreción de la Gerencia). Adicionalmente, se establece que la afectación de este tipo de cambio es para pocos usuarios y no degrada, ni suspende servicios. A continuación, se mencionan algunos cambios considerados como estándar: Restauraciones de Producción a Desarrollo, Ejecución de Procesos como por ejemplo Incorporación de Reportes, Solicitudes de Acceso, Creación y/o Actualización de Perfiles, Cambios del Administrador de Cuentas, entre otros que puedan irse documentando y estandarizando.
- **Planificado:** Se puede definir como Cambio Planificado, un cambio el cual es discutido en el Comité de Cambios (Bajo o Mediano Impacto) o Comité Ejecutivo de Cambios (Alto Impacto). Así mismo, para los casos en que la implementación sea compleja, involucre

múltiples áreas, requiera varios puntos de control y/o demande la intervención del Proveedor.

URGENCIA

- Dicho término, corresponde al retraso en tiempo aceptable para el usuario y para el negocio. Es el grado percibido de preocupación por el incidente basado en otros criterios (sensibles al tiempo). Por tal motivo, se debe seleccionar a través de la lista desplegable el tipo de urgencia. Sin embargo, dicha elección debe hacerse respetando los criterios que se mencionan a continuación:
    - **Urgente:** Cambios requeridos para resolver un incidente, requerimiento o problema crítico, para la continuidad del negocio, ya que la solución temporal puede no ser suficiente.
    - **NO Urgente:** Cambios que pueden ser ejecutados en un tiempo aceptable, a fin de evitar afectación tanto para el usuario, como para el negocio.

IMPACTO

- Se refiere al número de usuarios/módulos/gerencias del negocio, los cuales están siendo afectados. Es el grado en el cual la pérdida del servicio impactará en el negocio. En este rubro, se debe indicar el efecto del cambio en el Proceso del Negocio, según la siguiente explicación:
    - **Alto:** La ejecución puede afectar negativamente un servicio de misión crítica y/o a un alto volumen de usuarios, clientes (internos y externos), así como la infraestructura tecnológica y el negocio. Por tal motivo, requiere de una mayor coordinación entre las áreas involucradas y el comité correspondiente en caso de ser de Alto Impacto.
    - **Medio:** Puede impactar algunos servicios no críticos, así como usuarios internos. Dicho cambio, requiere de coordinación y esfuerzo para su ejecución.

- **Bajo:** Su ejecución no afecta el servicio y requiere de poco esfuerzo.

PRIORIDAD

Esta información es indicada de forma automática, rigiéndose por la siguiente regla de negocio:

URGENCIA	IMPACTO	PRIORIDAD
URGENTE	ALTO	EJECUCIÓN INMEDIATA
URGENTE	MEDIO	ALTA
URGENTE	BAJO	MEDIA
NO URGENTE	ALTO	ALTA
NO URGENTE	MEDIO	MEDIA
NO URGENTE	BAJO	BAJA

- **Ejecución Inmediata:** Debe ser ejecutado de inmediato, ya que existe la pérdida del servicio o afectación severa a la continuidad operativa del negocio, así como a clientes internos y/o externos. Esta prioridad refleja, que el cambio es de misión crítica.
- **Alta:** Se otorga alta prioridad, a los servicios que pueden estar afectando severamente cierta cantidad de usuarios, o a un gran número de ellos.
- **Media:** Servicio que no está siendo afectado en forma severa. Sin embargo, el cambio no puede ser diferido.
- **Baja:** Cambio que está justificado y es necesario, pero puede esperar.

TIPO DE ORIGEN

Es importante señalar que los cambios pueden originarse por inclusión de nuevos servicios o nuevas versiones e incluso por redirecciones estratégicas, las cuales pueden afectar los niveles de servicio ofrecidos, entre otros, y que por regla general requieren de cambios de hardware, software

y/o procedimientos. Por tal motivo, se debe indicar la naturaleza de la solicitud, a través de la lista desplegable, cuyas opciones se explican a continuación:

- **Gestión de Solicitud:** Solicitudes estandarizadas, las cuales están estrictamente ligadas con los “Cambios de Tipo Estándar”.
    - **Incidente:** Son aquellas situaciones que son manifestadas por usuarios internos. Las mismas están relacionadas con degradaciones y/o afectaciones de un sistema bien sea crítico o no. Este evento puede ser registrado de forma individual por un usuario afectado. Es importante señalar, que todos los incidentes sin importar el impacto, están estrictamente relacionados con “Cambios de Tipo Emergencia”. Es importante dejar asentado, que las “Emergencias de Bajo Impacto” y “Emergencias de Medio Impacto”, no necesitarán de la activación de un Comité de Cambios de Emergencia.
    - **Problema:** Es la causa de uno o más incidentes del mismo tipo, el cual se desconoce su causa raíz y por lo que es requerida su investigación, a fin de determinar la posible solución.
    - **Proyecto:** Solicitudes realizadas internamente por usuarios, las cuales requieren un desarrollo a mediano o largo plazo y se rigen por una planificación la cual surge como respuesta a una necesidad y consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, que apuntan a lograr un resultado único para poder alcanzar objetivos específicos dentro de un lapso de tiempo previamente definidos.
    - **Requerimiento:** Solicitudes realizadas por los usuarios y las cuales requieren un desarrollo a corto plazo. Necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un producto o servicio.


12. Documentación Soporte para las Restauraciones

ITEM	DETALLES
1	Nombre de (los) archivos(s).
2	Ruta(s) de ubicación del archivo (origen y destino).
3	Fecha de inicio y fecha fin, de uso de la data.
4	En el caso de restauraciones de Base de Datos, indicar la estructura de los campos que la conforman.
5	Requerimiento (Operativo o Regulatorio), Incidencia, Problema o Proyecto, al cual está relacionado la solicitud de restauración y el nombre de la persona del mismo.
6	Frecuencia con la que sea necesaria esta solicitud.
7	Detallar el query que se ejecutará después que sea restaurada la data.
8	Formato en el que sea generado el resultado del query.
9	Descripción de los campos que contendrá el resultado del query.
10	Una vez generada la información, como se entrega al usuario final y/o a los entes regulatorios (vía correo, en una carpeta compartida, en un reporte en el Doc Path, otros).
11	Indicar los nombres y códigos de usuarios finales a los cuales se les entregará la información. En el caso de los entes regulatorios, indicar la(s) persona(s) contacto a la que se le(s) hará entrega de la información.
12	Comunicados u otros oficios, de los entes regulatorios o usuarios funcionales que solicitan dicha data.
13	Especificar si se está automatizando esta solicitud? Cuanto tiempo se llevará a cabo el pase a producción?
14	Evidencias que demuestren la eliminación de la información restaurada **(Definición del responsable).**

13. Tipo de Cierre de Cambio

TIPO DE CIERRE	DESCRIPCIÓN
CERRADO CANCELADO	El cambio ha sido suspendido y postergado para una nueva fecha, por motivos que impiden su ejecución en la fecha y hora acordada.
CERRADO RECHAZADO	El cambio ha sido anulado.
CERRADO FALLIDO	El cambio requiere la ejecución del reverso y dependiendo del impacto, se activa el plan de contingencia de cambio.
CERRADO EXITOSO	El cambio ha sido cerrado de forma exitosa.

14. Formato "Solicitud de Cambio IT" (VEN-301-0009-05-0024).

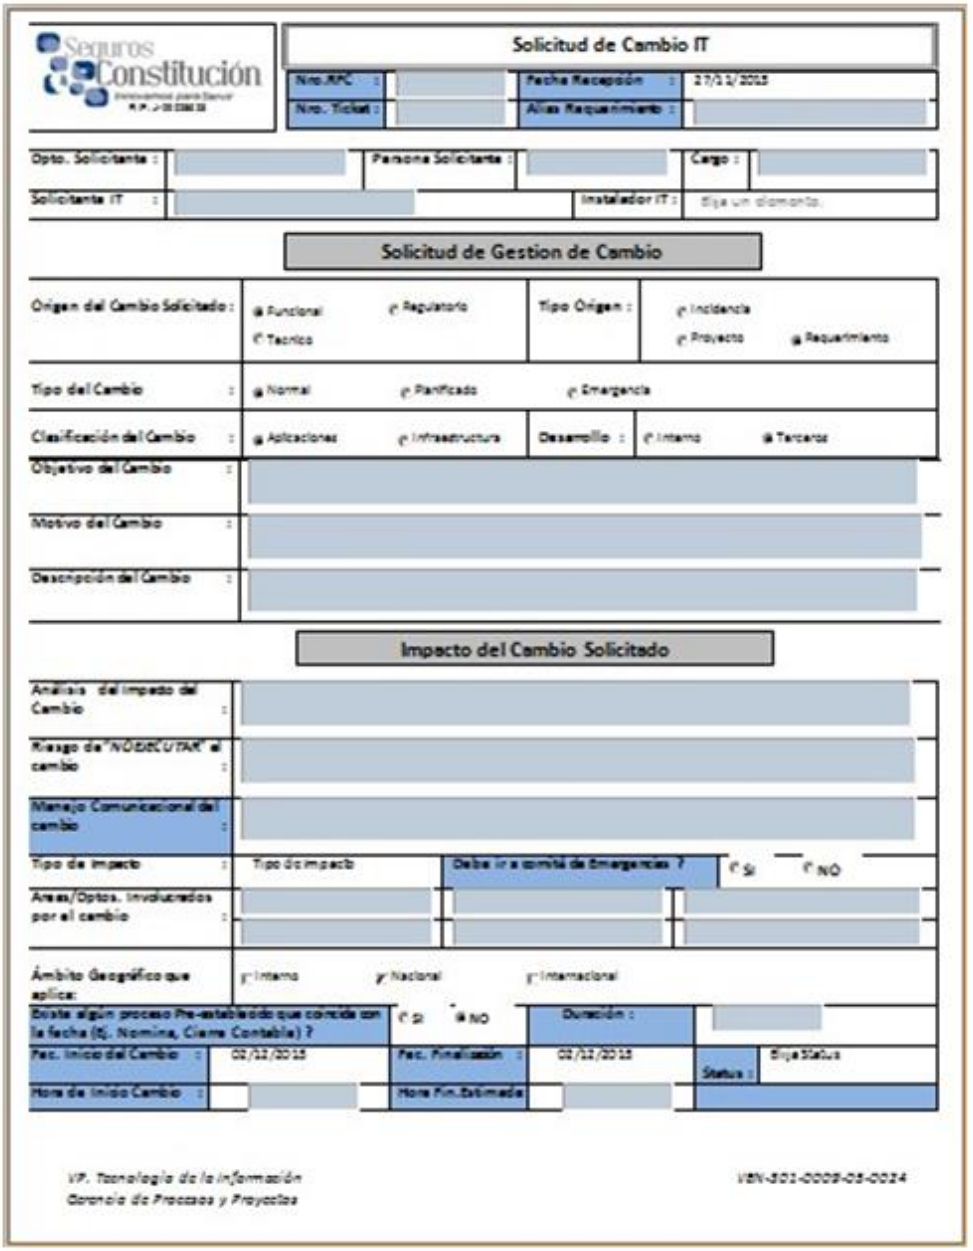

Seguros Constitución

Solicitud de Cambio IT

Nro.RFC : | Fecha Recepción : 27/11/2015
Nro. Ticket : | Alias Requerimiento :

Depto. Solicitante : | Persona Solicitante : | Cargo :
Solicitante IT : | Instalador IT : Elija un elemento.

Solicitud de Gestion de Cambio


Origen del Cambio Solicitado : (•) Funcional ( ) Regulatorio ( ) Técnico | Tipo Origen : ( ) Incidencia ( ) Proyecto (•) Requerimiento
Tipo del Cambio : (•) Normal ( ) Planificado ( ) Emergencia
Clasificación del Cambio : (•) Aplicaciones ( ) Infraestructura | Desarrollo : ( ) Interno (•) Terceros
Objetivo del Cambio :
Motivo del Cambio :
Descripción del Cambio :

Impacto del Cambio Solicitado

Análisis del Impacto del Cambio :
Riesgo de "NO EJECUTAR" el cambio :
Manejo Comunicacional del cambio :
Tipo de Impacto : Tipo de Impacto | Debe ir a comité de Emergencias ? ( ) SI ( ) NO
Areas/Optos. Involucrados por el cambio :
Ámbito Geográfico que aplica: ( ) Interno ( ) Nacional ( ) Internacional
Existe algún proceso Pre-establecido que coincida con la fecha (Ej. Nomina, Cierre Contable) ? ( ) SI (•) NO | Duración :
Fec. Inicio del Cambio : 02/12/2015 | Fec. Finalización : 02/12/2015 | Status : Elija Status
Hora de Inicio Cambio : | Hora Fin.Estimada :

VP. Tecnología de la Información
Gerencia de Procesos y Proyectos

VEN-301-0009-05-0024

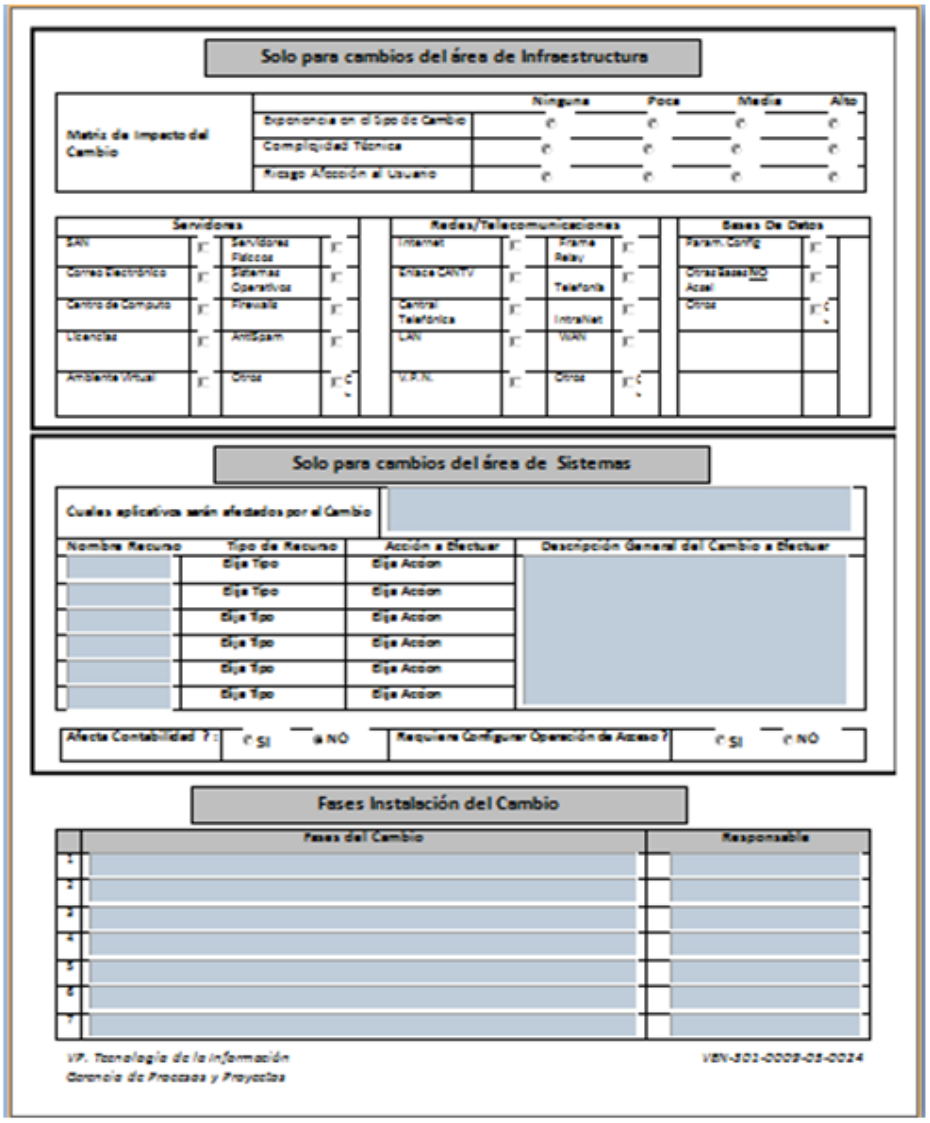

Solo para cambios del área de Infraestructura

Matriz de Impacto del Cambio	Ninguna	Poca	Media	Alto
Exponencia en el Tipo de Cambio				
Complejidad Técnica				
Riesgo Afección al Usuario				

Servidores				Redes/Telecomunicaciones				Bases De Datos		
SAN		Servidores Físicos		Internet		Frame Relay		Param. Config		
Correo Electrónico		Sistemas Operativos		Enlace CANTV		Telefonía		Otras bases NO Acasi		
Centro de Cómputo		Firewalls		Central Telefónica		Intranet		Otros		
Licencias		Antispam		LAN		WAN				
Ambiente Virtual		Otros		V.P.N.		Otros				

Solo para cambios del área de Sistemas

Cuales aplicativos serán afectados por el Cambio

Nombre Recurso	Tipo de Recurso	Acción a Efectuar	Descripción General del Cambio a Efectuar
	Elija Tipo	Elija Acción	
	Elija Tipo	Elija Acción	
	Elija Tipo	Elija Acción	
	Elija Tipo	Elija Acción	
	Elija Tipo	Elija Acción	
	Elija Tipo	Elija Acción	


Afecta Contabilidad ?: SI NO — Requiere Configurar Operación de Acceso ?: SI NO

Fases Instalación del Cambio

	Fases del Cambio	Responsable
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

VP. Tecnología de la Información
Gerencia de Procesos y Proyectos

VEN-301-0009-01-0002

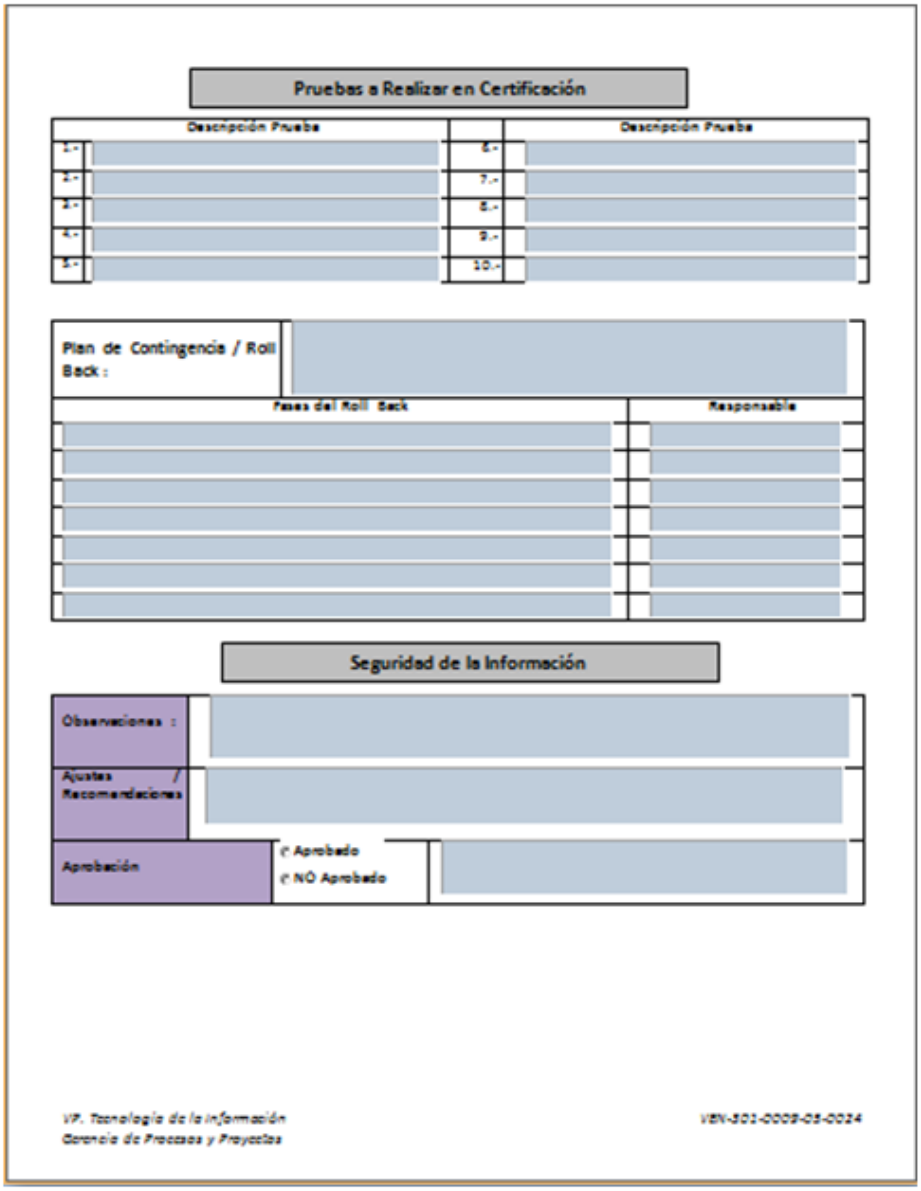

Pruebas a Realizar en Certificación

Descripción Prueba		Descripción Prueba
1.-	6.-	
2.-	7.-	
3.-	8.-	
4.-	9.-	
5.-	10.-	

Plan de Contingencia / Roll Back :	

Pasos del Roll Back	Responsable

Seguridad de la Información

Observaciones :		
Ajustes / Recomendaciones		
Aprobación	(Aprobado (NO Aprobado	

VP. Tecnología de la Información
Gerencia de Procesos y Proyectos

VEN-301-0009-01-0024

Leyenda:

	Información a ser suministrada por el área de Seguridad de la Información.
	Información a ser suministrada por el área de Control de Cambios.
	Espacios en blanco deben ser llenados por el Área solicitante.
